专 业 学 位 硕 士 学 位 论 文

J 公司开发项目沟通管理问题与对策研究

Research on communication management problems and countermeasures of development projects in J company

作 者 姓 名：杨婷婷

学　　号：42211248

指 导 教 师：孙玉涛

学科、 专业：工商管理

答 辩 日 期：2024 年 11 月 24 日

大连理工大学

Dalian University of Technology

中国知网 https://www.cnki.net

摘　　要

当前，新能源汇流排通过高效电能传输、轻量化设计以及高电气安全性等多方面的优势，持续推动着新能源产业的快速和创新发展。J 公司也因此而瞄准了新能源汽车汇流排市场，建立了汇流排事业部专注于汇流排的开发和制造。近年来 J 公司汇流排开发项目沟通管理问题却越来越凸显，对项目的整体进度、成本、质量都造成了不同程度的影响，本文的目的在于解决 J 公司汇流排开发项目的沟通管理问题。

本文通过分析 J 公司汇流排开发项目的背景、项目沟通管理特点以及当前的沟通管理现状，揭示了其在项目沟通管理中所暴露出的主要问题，即：项目沟通计划延期频繁、团队成员沟通信息失真、项目沟通方式不当、团队成员缺乏主动沟通意愿。并结合相关理论分析其问题产生的根本原因，比如 J 公司项目沟通管理成熟度低，企业内部尚未建立项目沟通管理的监督和改进机制，也未对项目成员进行项目绩效考核，也没有任何奖惩机制，导致员工的沟通执行力差，在沟通行为上缺乏有效的约束和管控。在项目信息沟通的过程中，由于个体的知识经验水平的差异导致个体在信息接受和传达过程中存在信息失真。现有的沟通管理制度虽规定了项目组的沟通方式，但却未规定不同沟通方式所对应的使用规范，导致项目成员沟通方式运用不当。组织的沟通氛围差，影响了员工的沟通积极性。基于以上种种沟通管理问题，本文对此提出了一系列改进措施。首先，建立项目沟通管理的监督和持续改进机制、项目绩效考核机制、项目沟通奖惩机制，从多维度对员工的沟通行为进行约束和激励。其次，通过优化导师带徒活动，定期举办沟通技能的培训，来增强员工的专业实践经验、提升其沟通技能。此外，进一步完善现有的沟通方式，并明确微信的使用规范，使得成员能够根据沟通的特点选择合适的沟通方式。最终通过营造积极向上的沟通氛围、建立合理的沟通反馈机制、完善项目的沟通渠道使成员，来促进成员积极主动沟通。为了确保改进措施的有效实施，还制定了一系列保障措施包括营造适合于沟通的积极向上的组织文化，设立项目激励资金库、引入适合于 J 公司的项目管理信息系统以及保证充足的人力资源。

本文对 J 公司开发项目沟通管理的研究，不仅能够帮助 J 公司项目开发组解决实际的沟通管理问题，提升项目管理效能。同时，也为同行业的同仁们在遇到相似挑战时，提供一套切实可行的参考模板，从而促进整个行业沟通管理实践的持续改善与提升。

关键词：汇流排；开发项目；沟通管理

中国知网　https://www.cnki.net

ABSTRACT

At present, the new energy bus continues to promote the rapid and innovative development of the new energy industry through the advantages of efficient power transmission, lightweight design and high electrical safety. Therefore, J Company also targeted the new energy vehicle bus market, and established the bus business department to focus on the development and manufacturing of bus. In recent years, the communication management problems of J Company's busbar development projects have become more and more prominent, which have caused varying degrees of impact on the overall progress, cost and quality of the project. The purpose of this paper is to solve the communication management problems of J Company's busbar development projects.

By analyzing the background of J Company's busbar development project, the characteristics of project communication management and the current situation of communication management, this paper reveals the main problems exposed in project communication management, namely: poor implementation of communication plan, distorted communication information of team members, improper use of project communication methods, and lack of active communication willingness of team members. Based on relevant theories, the root causes of the problem are analyzed. For example, the maturity of project communication management in Company J is low. The company has not yet established a supervision and improvement mechanism for project communication management, nor has it conducted project performance assessment for project members, nor has it any reward and punishment mechanism, resulting in poor communication execution ability of employees and lack of effective restraint and control on communication behaviors. In the process of project information communication, there is information distortion in the process of receiving and conveying information due to the difference of individual knowledge and experience level. Although the existing communication management system stipulates the communication methods of the project team, it does not specify the use norms corresponding to different communication methods, resulting in no corresponding rules for project members to follow in the application of communication methods and improper use of communication methods. Based on the above communication management problems, this paper puts forward a series of improvement measures. First of all, the supervision and continuous improvement mechanism of project communication management, project performance appraisal mechanism, project communication reward and punishment mechanism should be established to restrict and motivate employees' communication behavior from multiple dimensions. Secondly, by

中国知网 https://www.cnki.net

optimizing mentoring activities and holding regular communication skills training, employees can enhance their professional practical experience and improve their communication skills. In addition, further improve the existing communication methods, and clarify the use of wechat norms, so that members can choose appropriate communication methods according to the characteristics of communication. Finally, by creating a positive communication atmosphere, establishing a reasonable communication feedback mechanism, and improving the communication channels of the project, members can promote active communication. In order to ensure the effective implementation of the improvement measures, a series of safeguard measures have been developed, including the creation of a positive organizational culture suitable for communication, the establishment of a project incentive fund, the introduction of a project management information system suitable for Company J, and the guarantee of adequate human resources.

This paper's research on the communication management of development projects of Company J can not only help the project development team of Company J to solve practical communication management problems, but also improve the efficiency of project management. At the same time, it also provides a set of practical reference templates for colleagues in the same industry when they encounter similar challenges, so as to promote the continuous improvement and promotion of communication management practices in the entire industry.

Key Words：Busbar; Development projects; Project communication management

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

1 绪论.....1
1.1 研究的背景和意义.....1
1.1.1 研究的背景.....1
1.1.2 研究的意义.....2
1.2 项目沟通管理研究综述.....2
1.2.1 项目沟通障碍的研究.....2
1.2.2 项目沟通方式的研究.....3
1.2.3 项目沟通策略的研究.....5
1.2.4 研究述评.....6
1.3 研究方法和内容.....6
1.3.1 研究的方法.....6
1.3.2 研究的内容.....8
2 项目沟通管理的相关基础理论.....9
2.1 项目沟通及项目沟通管理的定义.....9
2.1.1 项目沟通的定义.....9
2.1.2 项目沟通管理的定义.....10
2.2 项目沟通管理理论基础.....12
2.2.1 项目沟通管理成熟度模型.....12
2.2.2 阿吉里斯“不成熟-成熟“理论.....13
2.2.3 组织沟通氛围理论.....14
3 J 公司开发项目沟通管理问题及成因分析.....16
3.1 J 公司及其开发项目介绍.....16
3.1.1 J 公司介绍.....16
3.1.2 J 公司开发项目沟通概况.....18
3.1.3 J 公司开发项目沟通管理特点.....21
3.2 J 公司开发项目沟通管理存在问题.....22
3.2.1 项目沟通计划延期频繁.....23
3.2.2 团队成员沟通信息失真.....25
3.2.3 项目成员沟通方式不当.....26
3.2.4 团队成员缺乏主动沟通意愿.....27
3.3 J 公司开发项目沟通管理问题成因.....29
3.3.1 沟通计划缺乏制度化保障.....30
3.3.2 部分项目团队成员实践经验少.....32
3.3.3 项目沟通方式的规范不清晰.....33

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.4 组织缺乏健康的沟通氛围.....34
4 J 公司开发项目沟通管理改进策略.....36
4.1 完善项目的沟通管理制度.....36
4.1.1 建立项目沟通管理的监督和持续改进机制.....36
4.1.2 建立项目绩效考核机制.....37
4.1.3 建立项目沟通奖惩机制.....39
4.2 丰富员工的专业实践经验.....40
4.2.1 优化导师带徒活动.....41
4.2.2 定期举办沟通技能的培训.....42
4.3 明确项目沟通方式的标准规范.....43
4.3.1 完善项目沟通方式.....43
4.3.2 明确微信的使用规范.....44
4.4 营造友好的组织沟通氛围.....44
4.4.1 营造积极向上的沟通氛围.....44
4.4.2 建立合理的沟通反馈机制.....46
4.4.3 完善项目沟通的渠道.....47
5 J 公司开发项目沟通管理改进保障措施.....49
5.1 组织文化保障.....49
5.2 项目激励资金保障.....50
5.3 项目管理信息系统保障.....51
5.4 人力资源保障.....52
6 结论.....54
参考文献.....56

中国知网 https://www.cnki.net

图目录

图 1.1 技术路线图.....7
图 2.1 沟通路径.....9
图 2.2 项目沟通管理过程.....11
图 2.3 项目沟通管理成熟度模型.....12
图 3.1 汇流排事业部组织结构图.....17
图 3.2 汇流排项目组织结构图.....18
图 3.3 J 公司项目信息沟通失真情况.....25
图 3.4 J 公司项目沟通管理问题成因汇总示意图.....30

中国知网 https://www.cnki.net

表目录

表 2.1 阿吉里斯 不成熟-成熟理论.....13
表 3.1 J 公司汇流排项目沟通方式和沟通频率.....21
表 3.2 J 公司开发项目沟通管理问题.....22
表 3.3 J 公司项目沟通计划执行情况.....23
表 3.4 J 公司开发项目突发事件统计.....25
表 3.5 J 公司项目组成员微信群聊情况.....27
表 3.6 J 公司项目沟通管理成熟度分析.....30
表 3.7 J 公司开发项目沟通计划.....31
表 3.8 J 公司开发项目成员基本信息表.....32
表 4.1 绩效分数-绩效发放比例对应表.....39

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪论

本章主要讲述了论文的研究背景、研究意义、研究方法、研究内容及。另从项目沟通障碍、项目沟通方式、项目沟通策略三个维度进行了项目沟通相关文献的研究分析。

1.1 研究的背景和意义

1.1.1 研究的背景

近些年，全球主要汽车工业大国竞相强化战略部署，加强对各个车企的政策扶持力度，促使各大汽车制造商加大科研投资，优化产业链布局。新能源汽车作为汽车产业转型升级的核心趋势，已跃升为全球经济增长的新动力源，引领着世界经济向更加绿色、可持续发展的方向发展。目前我国新能源汽车的发展已经进入高速发展期，新能源汽车的销量也从 2020 年不足 1 万辆增长到 2021 年的 330 万辆。随着新能源汽车市场规模的不断增长，也在迫使各制造商寻求技术革新来提高车辆的效率、功率和性能。在新能源汽车中，大量电池组合在密封模组中，用于实现为车辆电动机供电所需的工作电压和电流，为车辆的电动机提供动力。目前该领域存在的 2 个主要问题为电力存储和续航里程。当下各电池制造商正在通过 2 种方式解决这个难题：制造更大的电池以实现更大的续航里程，以及制造更强大的电池以实现更快的充电速度。但是目前这 2 种方法都面临着巨大的挑战。电池可以变的更大，但是其只能在变得太贵太重而无法成为可行的解决方案之前达到一定的尺寸。传统布线不是人们寻求新能源汽车创新的第一选择，但最近的进步对新能源汽车产生了重大的影响，因为他们为 OEM 提供了两件事，在他们的电动汽车架构中迫切需要：更小的质量和更多的空间，而腾出空间和减轻质量的一种方法是从圆形布线转向扁平导体，这也就促进了电动汽车汇流排的诞生和发展。电动汽车的日益普及、成本效益、易于安装、维修和服务成本低等特点，以及充电基础设施的不断完善，成为促使汽车汇流排需求不断增长的关键因素。根据市场研究，预计 2030 年市场将产生数亿美元的汇流排收入，2021-2030 年复合增长率可达 24.6%。

J 公司正是因为看到了这样的市场机遇，于 2021 年收购某 S 公司，成立新能源事业部，专注于各种类型汇流排的开发、制造及销售。对于大部分 OEM 企业来讲，在市场竞争中主要以价格优势、制造能力取得订单，J 公司也不例外，因此这就对 J 公司的项目管理水平提出了更高的要求。为了顺应客户降本的要求，汇流排的开发项目涉及大量的工艺创新，以及对外和对内跨部门的沟通，项目管理工作面临诸多挑战。长期以来，J 公司高层管理者对于项目沟通管理的重视度不足，J 公司的发展也遇到了前所未有的压力。当前 J 公司开发项目的沟通管理结果不甚理想，由于沟通不及时、沟通信息不准确、

中国知网 https://www.cnki.net

沟通不畅等造成的项目问题比比皆是，如在项目开发设计环节，由于团队成员沟通信息不准确，导致开发图纸反复修改，项目进度延期。又例如在项目试产阶段，由于相关人员没有及时反馈生产设备的维修进度，导致生产计划被延误。为了确保 J 公司开发项目能够如期且高质量的完成，J 公司亟需深化沟通管理机制，采取高效的沟通策略，消除跨部门沟通壁垒，增强跨部门协作的效率和协同能力，从而为开发项目的顺利推进奠定坚实的基础，促进整体沟通效率与沟通质量的提升。

1.1.2 研究的意义

项目沟通管理作为项目管理工作的核心，贯穿于项目管理的始终，决定着项目管理的成败。PMI 制定的 PMBOK 也将项目沟通管理作为管理知识体系中一个单独领域的存在，足以可见沟通管理在项目管理中的重要程度。基于 J 公司汇流排开发项目沟通现状背景，本文的研究意义主要有以下两点：

（1）改善 J 公司汇流排开发项目沟通管理问题。通过对 J 公司汇流排开发项目的沟通管理现状进行深入的审视，剖析沟通管理环节中涌现出来的各种问题，并运用相关沟通管理理论追溯导致沟通管理问题的根源所在，进而提出相应的改善策略及保障措施，确保项目沟通管理问题得到有效改善，以提升项目沟通管理水平，提升项目管理效率。

（2）为同行业的项目沟通管理提供具有实际意义的实践参考。在深入分析汇流排开发项目沟通管理所面临的挑战后，提炼出一套旨在优化此类项目沟通效率与质量的改善方案。此问题不仅针对具体问题提出解决方案，更具备广泛的适用性，可以为同行业提供有价值的参考与启示。

1.2 项目沟通管理研究综述

1.2.1 项目沟通障碍的研究

项目组织是指为了完成某个特定的项目任务而建立的一种临时性组织结构。这种组织结构在项目开始时形成，随着项目的推进而不断发展，并在项目结束后解散。

PMBOK 指南第 6 版指出项目组织是为了完成某个特定的项目任务而建立的一种临时性组织结构，这种组织结构在项目开始时形成，随着项目的推进而不断发展，并在项目结束后解散。项目组织通常包括项目经理，来自于各个部门组成的项目团队和其他利益相关者[1]。项目组织的特性决定了项目执行过程中必定会产生大量的跨部门沟通行为。项目组织进行跨部门沟通的主要原因不外乎:项目任务协调、项目问题解决、项目信息分享、项目成员间的冲突化解。跨部门沟通贯穿了项目执行的整个过程，而大部分项目在执行过程中的沟通效果并不尽如人意，其主要原因还在于项目内部存在的跨部门沟通

中国知网 https://www.cnki.net

障碍。

目前，关于项目沟通障碍的研究，虽然各个学者的理解各不相同，但均主要从组织视角和个人视角两个角度对其进行研究分析。

组织视角。殷晓琼认为，组织结构不完善、组织成员职权划分模糊、组织气氛不融洽等因素易导致跨部门沟通障碍，此外张凌云在得出与殷晓琼类似的结论下，又补充了沟通双方信息不对称、个人意识层面的本位主义思想及利益分配的障碍因素[2]。部门间职责界限的模糊与不明确划分，进一步加剧了部门利益交织的复杂性，从而导致跨部门沟通障碍。吴全能和陈丽明又在此基础上补充了组织信息系统不完善的障碍因素。组织信息系统，作为企业内部各部门间沟通的关键桥梁，其完善程度直接影响到沟通的流畅性。若系统建设不足，沟通渠道受阻，加之双方信息获取的不对称，均会显著家具跨部门沟通的挑战，影响整体协作效率。

个人视角。韩广彦认为个体障碍包括个体认知的偏差、语言交流的障碍或是个人主观情绪所产生的障[3]。项目中的成员来自各个部门，其所拥有的专业知识和个人背景均不同相同，导致了个体在认知方面的差异，或者是由于语言不同所导致的交流障碍。在项目合作中，每位成员在交流时均会带有个人的情感色彩，任何非专业的沟通方式或不恰当的言辞，军可能成为阻碍跨部门顺畅交流的无形壁垒。李卉和阮相君等学者还指出，个体在选择性认知方面扮演了重要角色，正如古语所云：“人皆倾向于接纳其愿信之事。“这一观点深刻揭示了人们倾向于偏好那些对自身有利的信息，而往往忽视或者回避可能带来不利影响的咨询[4]。在沟通情境中，若仅聚焦于悦耳的言辞，忽视全面信息的汲取和深入理解，势必会削弱整体沟的通效果和质量，导致理解偏颇与决策失衡。

从以上相关研究结论不难看出，影响项目组织跨部门沟通的主要因素无外乎 2 个层面，即组织层面和个人层面。笔者也将借鉴上述因素对 J 公司汇流排开发项目存在的沟通障碍进行具体分析。

1.2.2 项目沟通方式的研究

从项目组织视角来看，项目沟通分为正式沟通和非正式沟通。学者刘碧莹指出正式沟通是指项目组织中依据规章制度明文规定的原则和渠道进行的沟通。正式沟通是组织最常用的沟通形式，项目管理者通过正式平台例如线上或线下项目会议、项目报告、邮件通讯、项目文档、项目管理软件等加强管理。非正式沟通指的是通过正式沟通渠道以外的信息交流和传达方式，管理者可以通过如项目团建、社交活动、社交媒体平台、即时通讯工具、非正式会议等方式来有效汇集并核实项目信息，从而加项目信息在项目团队内部的流转速率。这一过程不仅可以促进信息的广泛传播，还是的管理者能够从多个维度和视角深入审视信息的可信度，最终确保组织内部环境的和谐稳定与高效运作。[5]。

中国知网 https://www.cnki.net

基于张莉、林与川及迟冬梅对黑龙江的 23 家企业，覆盖超过 373 名员工的数据进行深入分析，研究采用了相关性分析、回归分析等等多元统计技术。结果显示，在企业内部的垂直沟通体系内，正式沟通与非正式沟通均对提升沟通满意度展现出积极影响，尤为显著的是正式沟通路径的效应。进一步研究分析表明，虽然两者均正面作用于沟通满意度，但在这一过程中，非正式沟通收到的调节性影响相较于正式沟通更为突出，显示了其作为补充与调节沟通管理效果的重要性[6]。非正式交流，作为正式沟通渠道的辅助与延伸，能够有效填补正式场合下难以满足的员工沟通空白，关键在于需要对其实施恰当的管理与积极的导向，确保这一交流模式能够顺应项目目标，促进正向发展，从而成为推动项目成功的有力补充[7]。杰克·韦尔奇，美国通用电气（GE）公司的传奇领袖，被誉为“20 世纪管理界的璀璨明星”之一。初掌舵盘时，GE 深陷层级壁垒森严、组织架构冗余的困境。韦尔奇毅然决然地发起了一场深刻的变革，核心在于引入“非正式交流”的先进管理理念，彻底颠覆了传统沟通模式。他身体力行，频繁以手写便签或亲自致电的方式与员工直接沟通，彰显了他对沟通无界限的深刻理解。在韦尔奇的愿景中，沟通应当是无拘无束、自然而然的，他致力于在公司内部营造一种温馨如家、亲密无间的氛围，让每位员工都能感受到如同亲友般的紧密联系。这种环境不仅促进了信息的自由流通，更激发了员工的参与热情与成长潜力，确保了每位成员都能获得展现自我、共同发展的宝贵机会。通过这一系列举措，韦尔奇极大地增强了管理层与员工之间的共鸣与理解，构建了基于相互尊重与深厚情感的坚实桥梁，为 GE 的转型与腾飞奠定了坚实的基础。

从沟通信息的传递方向来分析，项目沟通可细化为横向沟通与纵向沟通两大维度。横向沟通，亦称为平行交互式沟通，它主要发生在组织内部各个职能部门之间，强调的是部门间的直接交流与合作，在此过程中，参与方并不具备直接的层级隶属关系，确保了沟通的自由与高效。在项目组织架构中，横向沟通的形式丰富多样，包括但不限于部门例会、协调研讨会、员工深度交流会、专题汇报会以及定期业务培训会议等，这些活动促进了跨部门间的信息流通与协作。至于纵向沟通，则细化为上行沟通与下行沟通两个面向，其中，下行沟通是指信息的流动由项目组织的较高层级流向较低层级。上行沟通是纵向沟通的关键，指自下而上由下级主动向上级报告工作情况、提出建议、意见或表达自己意愿等的沟通形式。

从沟通渠道的角度来分析，项目沟通方式又分为语言沟通和非语言沟通，其中语言沟通又包括口头沟通和书面沟通。杰哈德·葛史汪德纳的深入研究表明，在口头交流的过程中，信息传递的丰富性远超单纯的语言内容。具体而言，高达 55%的信息量源自非言语的肢体语言，包括姿态、眼神交流及面部表情的微妙变化；而语调、语速等声音特

中国知网 https://www.cnki.net

质则承载了约 38%的信息，进一步丰富了沟通的内涵；相比之下，直接通过词汇表达的信息仅占 7%，凸显了非语言因素在沟通中的主导地位。这一发现强调了全面理解沟通信息时，对非语言信号的敏锐捕捉与解读的重要性[8]。

赖利夫妇的深入探索揭示了外界环境因素对沟通行为中信息传达方式的显著影响，同时指出，这一影响也是双向的：即便信息本身保持一致，接收者的环境背景也会深刻左右其对所接收信息的解读与理解，从而进一步丰富了沟通复杂性的维度。

学者王培才在既有研究基础上，进一步提炼出沟通成效的核心在于沟通模式的恰当选择。各类沟通模式各具特色，其适用性因场合、工作情境的差异而异。鉴于此，为了优化沟通质量，我们需依据具体的沟通场景、组织架构、交流议题、企业文化以及个体间的差异性，精心挑选并灵活运用不同的沟通方式。更进一步，根据实际情况，灵活组合多种沟通手段，以实现更加精准、高效的沟通效果[9]。

从上述研究可以得出，沟通方式按照其分类标准的不同，被划分为多种类型与方式。不同的沟通方式适用于不同的情境和项目组织环境，项目组在选用沟通方式时需要因地制宜。

1.2.3 项目沟通策略的研究

美国达特茅斯大学塔克商学院的杰出学者玛丽·蒙特教授，率先开创了沟通管理策略的理论先河。她构建的沟通策略分析框架，深刻而全面，涵盖了五大核心维度：首先是沟通主体的深入剖析，随后是沟通对象的精准定位，紧接着是信息策略的精细规划，再者是对沟通渠道的明智选择，最后是对文化背景因素的全面考量。这一框架为有效沟通管理提供了坚实的理论基础与实践指南[10]：

在沟通主体分析层面，核心聚焦于通过细致剖析促进沟通主体的自我觉知与角色定位清晰化。这涵盖了提升自我认知，进而优化沟通技巧与策略，以更有效地传达信息。

在沟通对象分析层面，首要任务是明确沟通对象的身份，深入探究其特性与沟通动机。通过分析沟通对象的构成、个性特征及其背景信息，能够预测并准备应对其可能的反应，确保信息传递的精准与有效。

信息策略分析则强调信息的精心构建与呈现方式。它要求确保信息内容的完整性，并在沟通过程中采用策略性的组织与表达方式，以增强信息的吸引力与记忆深度，实现信息的高效传递与接收。

渠道选择分析是信息传播路径的关键考量。在广泛筛选沟通渠道之前，需遵循一般性选择原则，充分考虑沟通对象的偏好、文化背景差异及沟通环境的约束条件。因此，选择沟通渠道需因人而异、因事制宜，以确保信息传递的顺畅与高效[11]。

最后，文化背景分析揭示了沟通策略制定中的深层次影响因素。跨文化沟通尤为复

中国知网 https://www.cnki.net

杂，它涉及不同文化背景间信息、知识与情感的交流与理解。面对天然存在的沟通障碍，我们应秉持尊重与开放的心态，深入了解并识别不同文化的差异，积极寻求共识与融合点，以达成沟通的最佳效果[12]。

综上所述，沟通管理策略的分析是一个多维度、深层次的过程，其广泛覆盖的层面为精准识别项目组织内潜在的沟通障碍提供了坚实基础。通过细致剖析这些层面，我们能够更有效地诊断出具体的沟通问题所在。基于此详尽分析所制定的解决方案，不仅更具针对性，还能确保对症下药，有效促进沟通效率与质量的双重提升。

1.2.4 研究述评

国内外学者们对于沟通管理的相关研究成果非常丰富，通过对文献的梳理和分析发现：关于沟通障碍的研究，主要从组织视角和个体视角两个角度进行系统分析，总结出项目组织中存在由于个体认知偏差、语言交流或者个人主观情绪所导致的个体沟通障碍；由于组织结构不完善、组织职权划分不清、气氛不融洽、利益分配不当、组织信息系统不完善所导致的跨部门沟通障碍。关于沟通方式的研究，主要从项目视角、信息流向视角、沟通渠道视角将项目沟通方式分为正式和非正式沟通、上行沟通和下行沟通及平行沟通、语言沟通和非语言沟通，总结出不同的沟通情境和项目组织下适用于不同的沟通方式。关于沟通策略的研究从多方面阐述，包括对沟通主体、沟通对象、沟通信息、沟通渠道、文化背景的深入研究。通过分析项目沟通管理相关文献，为本文探究 J 公司开发项目沟通管理的问题分析及改进策略提供了理论参考和借鉴。然而现有研究中，也存在以下几点不足：

第一，现有对项目沟通的研究大部分停留在普通项目的层面上，对新能源汽车零部件项目的沟通管理研究甚少。

第二，跨部门沟通障碍的研究中虽提到了导致沟通障碍的因素有组织结构因素，不同的组织结构必然导致沟通方式的差异。但较少文献提及各个不同组织架构及组织管理体系下如何高效地推进开发项目。

本文将结合前人研究的结果，运用理论联系实际的方法，着重于探讨如何在弱矩阵项目组织结构下有效地进行开发项目的沟通管理。

1.3 研究方法和内容

1.3.1 研究的方法

本文的研究方法如下：

文献分析法：本文借助于图书馆、知网及其他资源，搜集整理与本课题相关的专著、

中国知网 https://www.cnki.net

期刊、硕博论文、行业分析报告等学术资料，学习国内、外关于沟通管理研究的现状以及取得的科研成果，掌握项目沟通管理的相关理论，为研究的课题提供理论支撑。

实地调研法：为确保研究结果的客观性和准确性，本文采取了实地调研法，聚焦于J公司既往开发项目的实际案例，依托项目沟通管理理论的框架，深入剖析了J公司当前在项目沟通管理领域的现状。深入J公司内部，系统收集了项目管理过程中涉及的多维度数据与信息，并广泛与项目各利益相关方进行深入交流，从而构建起对J公司开发项目沟通管理现状及其所面临挑战的更为全面、客观的认知。这一过程不仅揭示了存在的问题，也为后续提出针对性的改进策略奠定了坚实基础。

理论联合实际法：在本文中，以J公司汇流排开发项目为研究对象，对其在项目沟通管理实践中所遇到的问题进行深入调查和分析，与开发、生产和管理团队进行积极充分的讨论，运用相关调查研究方法和项目沟通管理理论知识探究并确定问题产生的根本原因，最终制定适合于J公司汇流排开发项目沟通管理的改进方案以及确保方案可落地的保障措施。

本文的技术路线图如图1.1所示：

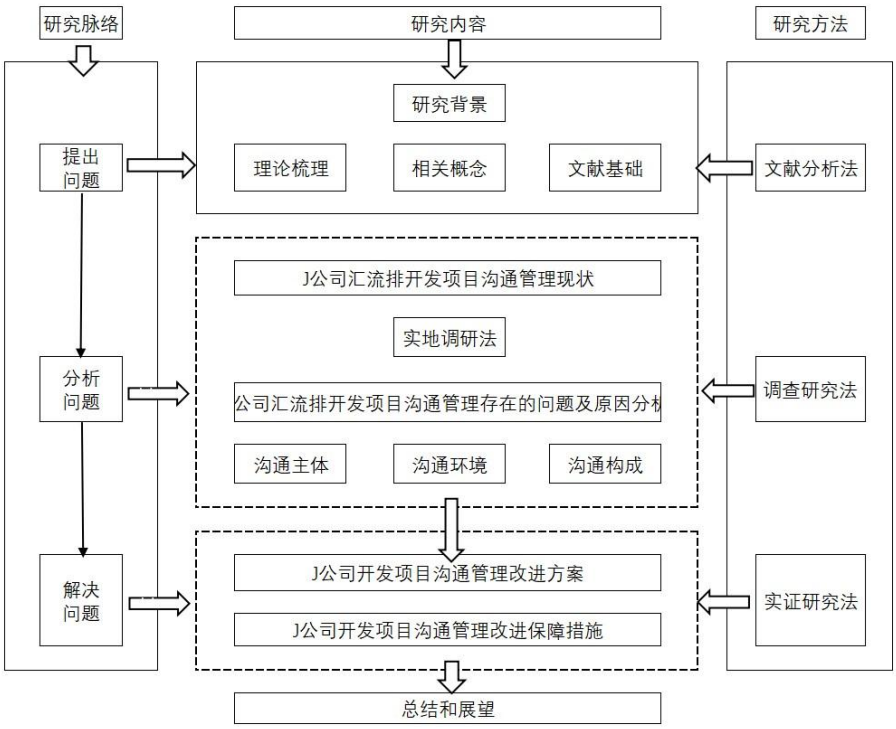

图 1.1 技术路线图

Fig. 1.1 Technology map

注：数据来源于J公司内部资料

中国知网 https://www.cnki.net

1.3.2 研究的内容

第一章为本文的绪论部分，主要介绍研究背景和意义、研究目的以及项目沟通障碍、沟通方式、沟通策略的相关文献研究。

第二章为本文的理论基础，通过查阅沟通管理的相关文献资料，从项目沟通及项目沟通管理的定义、项目沟通管理的具体理论进行相关研究与归纳，为改善 J 公司汇流排开发项目沟通管理问题提供理论支撑。

第三章为本文的核心部分，对 J 公司概况、汇流排产品开发项目的特点以及目前汇流排开发沟通管理现状等问题进行简述。通过实地调研法揭示 J 公司在汇流排开发项目沟通管理中存在的问题，即项目沟通计划延期频繁、团队成员沟通信息失真、项目成员沟通方式不当、团队成员缺乏主动沟通意识。对问题的原因进行了深入的分析和阐述，包含沟通计划缺乏制度化保障、部分项目团队成员实践经验少、项目沟通方式规范不清晰、组织缺乏健康的沟通氛围。

第四章主要针对当前 J 公司汇流排开发项目沟通管理中存在的问题和成因，提出具体的改进方案。包括完善项目的沟通管理制度、丰富员工的专业实践经验、明确项目沟通方式的标准规范、营造友好的组织沟通氛围。

第五章为 J 公司汇流排开发项目沟通管理问题的解决提供了一系列的保障措施，在提出的改进方案确认后，通过创建积极沟通氛围的组织文化、设立项目激励资金库、引入适合于 J 公司的项目管理信息系统、保证项目运行所需要的人力资源等措施，保障后续新产品开发项目的有效运行。

第六章为总结和展望。

中国知网 https://www.cnki.net

2 项目沟通管理的相关基础理论

本章通过对项目沟通的定义、项目沟通管理的定义、以及项目沟通管理过程、项目沟通管理的影响因素以及项目经理领导力对项目管理的影响五个方面来进行理论的梳理和研究，为后续的开发项目沟通管理问题的分析奠定理论基础。

2.1 项目沟通及项目沟通管理的定义

2.1.1 项目沟通的定义

不管是在我们日常的生活还是工作中，沟通无处不在。沟通，作为一种社会交往手段，既是一种为人处事的社交艺术，又是一项基本的管理技能。美国威斯康辛大学的Frank Dance 教授与 Carl Larson 教授曾联合进行了一项关于“沟通”定义的广泛统计，结果显示其定义之多竟逾百二十种，这一数字深刻揭示了沟通概念的复杂性与多维度性。尽管这些定义在表述形式上各有千秋，但它们所触及的沟通本质却呈现出惊人的一致性，共同指向了沟通这一人类交流活动的核心要义。可以将项目沟通理解为一个关于信息产生、传递、接收、理解和反馈的过程[13]。

项目沟通包括输出者、接受者、信息、渠道四个主要要素，具体路径参考下图 2.1[14]。

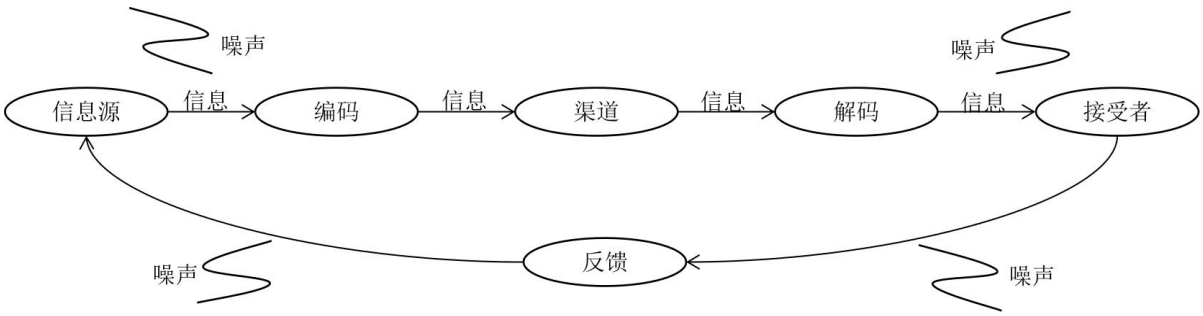

图 2.1 沟通路径

Fig. 2.1 Communication channel

注：数据来源于《项目管理沟通在项目管理中的应用》

需要特别强调的是，沟通是信息双向流动的过程，需要有信息的传递和反馈共同组成，如果仅有信息的传递，而缺乏接受者的反馈，通常意味着沟通的失败或者无效[15]。

输出者，信息的发起者作为信息的源头，需深刻理解接收方的背景与需求，以精选适宜的沟通路径，确保信息的有效传递。为此，对编码与解码过程的基本理解至关重要。编码，即是将思想、理解与情感体验转化为可传递信息的过程；而解码，则是接收者将这些信息还原为个人理解与感受的逆向过程。

中国知网 https://www.cnki.net

接受者，作为信息的终点，承担着将接收到的信息通过解码转化为自身可理解的意义与情感的职责。这一过程深受接收者过往经验、知识储备、能力水平、个人特质以及对信息发送者预期的影响。

信息，作为沟通的核心要素，涵盖了口头与非口头形式的所有传递给接收者的内容。值得注意的是，同一信息在发送者与接收者之间可能存在理解差异，这既可能源于双方背景与视角的不同，也可能因为信息发送时包含了不必要的冗余信息。

沟通渠道，作为信息传递的媒介，其形式多样，既包括正式与非正式的划分，也涵盖了上行、下行及平行沟通等多种渠道，这些渠道共同构成了信息流通的网络，确保了信息的广泛传播与有效交流。

2.1.2 项目沟通管理的定义

PMBOK 将项目沟通管理界定为一系列综合性的过程，旨在确保项目信息的时效性、准确性和适当性，这些过程覆盖了从规划、收集、创造、分发、存储、检索、监控、控制到最终处置的各个环节。项目沟通管理构筑了通往成功的基石，无缝连接了关键要素——人、思想与信息，使之在项目推进中协同作用。参与项目的各方需掌握项目专属的“交流密码”，能够熟练以项目语言为媒介，既传递也接收信息，并深刻认识到，作为个体所参与的每一次沟通，都是对项目整体进展与成效的微妙影响。对于项目组织而言，科学的组织架构、高效的指挥体系、顺畅的协调机制以及精确的控制流程，皆依赖于项目信息沟通管理的有效实施。有效的沟通管理不仅能推动项目稳步前行，还能积极促进团队成员间的人际和谐，为项目的成功与持续发展奠定坚实的基础。

项目沟通管理的实施流程涵盖了需求明确、沟通规划、沟通执行与监督四大关键阶段，这些阶段既可独立运作，亦在项目进程中相互交织，形成动态循环，如图 2.2 所述。

第一阶段，明确需求管理，作为项目沟通管理的起点，其重要性不言而喻。此阶段聚焦于收集并分析需求信息，以确立项目目标及各阶段规划，为后续沟通规划奠定坚实基础。需求信息犹如导航灯塔，不仅为项目管理者提供规划与决策的依据，更在项目执行中引领团队方向，确保项目航向不偏离既定目标。

第二阶段，规划沟通管理，旨在深入理解项目干系人的信息需求、项目内在需求，并结合组织过程资产及事业环境因素，精心制定沟通管理计划。该计划涵盖三大核心要素：沟通管理程序规范、沟通产出物的定义、以及沟通活动的具体安排。制定沟通计划时，需遵循六大核心原则：识别信息接收者、界定各干系人所需信息、明确信息共享目的、选择最佳信息传递方式、设定信息传递的时间与频率、以及确认信息来源。

中国知网 https://www.cnki.net

第三阶段，管理沟通，依据既定的沟通管理计划，全面展开信息的生成、搜集、发布、存储、利用及最终处置工作。此阶段不仅涉及信息的对外发布，更前置到信息的创造与收集环节，并延伸至信息有效性的后续确认，确保沟通链条的完整与高效。

第四阶段，监督沟通，作为项目沟通管理的闭环，其目的在于依据沟通计划，持续监控项目沟通状况，及时发现、记录并分析沟通中的偏差，采取相应措施进行干预调整，以确保项目信息能够精准满足各干系人的需求，维护项目沟通的顺畅与高效。

图 2.2 项目沟通管理过程

Fig. 2.2 Project communication management process

注：数据来源于《项目管理知识体系指南》第六版

项目沟通管理作为项目管理工作的基石，其高效运作对于促进项目干系人间的顺畅交流与信息即时共享至关重要，是推动项目进程、提升管理成功率的关键。它不仅为项目经理在面对突发状况或规划外情境时，提供了迅速且明智的决策依据[16]；还通过促进积极的人际互动，构建稳固的关系网络，从而营造积极向上的工作环境[17]；此外，优秀的项目沟通管理机制能够敏锐地识别并化解团队内部的潜在矛盾，强化团队协作氛围，促进项目目标顺利实现[18]。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2 项目沟通管理理论基础

2.2.1 项目沟通管理成熟度模型

项目沟通管理的成熟度模型可细化为五个循序渐进的阶段，分别是：初始阶段、结构化构建与标准化、组织整合与制度化、全面管理实施以及持续优化阶段[19]，如下图 2.3 详尽展示。

成熟度级别	成熟度级别详细描述	沟通计划	信息发布	绩效报告	问题跟踪与管理
初始阶段	缺乏正式沟通管理，依赖非正式方式 项目经理主导，缺乏标准化流程	无	非正式	无	非正式处理
结构化构建与标准阶段	开始建立基本沟通管理框架，但尚未全面标准化 识别沟通需求，但执行不一	初步建立	电子化/文件化 定期但不规律	初步报告 基本状态更新	初步跟踪记录 简单文档记录
组织整合与制度化阶段	沟通流程获得制度层面的支持 广泛覆盖项目大多数参与者的需求	正式制定	标准化流程 定期、透明发布	定期详细报告 绩效指标分析	详细跟踪记录 正式文档发布
全面管理实施阶段	沟通流程强制执行 所有项目遵循正式的沟通管理方案	正式制定并遵循	标准化流程 定期、高效信息发布	定期详细报告 高质量绩效指标分析	系统化跟踪与管理 风险评估与解决
持续优化阶段	持续优化沟通管理流程，引入质量管理指标 跨部门协作，持续改进 强调企业文化与沟通能力的融合	定期评估与更新 持续改进计划	高效信息发布系统 实时更新与反馈	高质量绩效报告 绩效指标驱动决策	闭环问题管理 经验教训总结分享

图 2.3 项目沟通管理成熟度模型

Fig. 2.3 Project communication management Maturity Model

注：数据来源于《项目管理中的沟通与协作策略》

在初始阶段，项目组织没有建立正式的沟通管理流程，沟通依赖于个人经验和习惯，往往是临时且无序的，项目沟通缺乏标准化的工具和方法，各项目之间的沟通方式不同。在此阶段，沟通的有效性较差，信息传递容易产生误解或延误，风险无法及时传达[20]。

在结构化构建与标准化阶段，项目团队着手建立基础的沟通管理流程框架，明确项目管理的边界条件与基本假设，确保项目管理状态与进展报告能够定期、透明地发布[21]。此阶段还特别强调了对项目各阶段成果及最终交付物的客户正式确认机制，以增强项目交付的可靠性与客户满意度[22]。

进入组织整合与制度化阶段，沟通流程获得了制度层面的支持，使得正式的沟通渠道成为项目运作不可或缺的一部分，广泛覆盖项目所需及大多数参与者的需求。管理层深度介入项目评估过程，不仅提供了宝贵的反馈意见，还促进了沟通内容的深度与质量提升[23]。

全面管理实施阶段标志着沟通管理过程的强制执行，所有项目均须遵循正式的沟通管理方案，该方案作为公司政策文件被正式确立，并融入公司整体运营框架之中。这一举措确保了沟通管理的一致性与高效性，为项目成功奠定了坚实基础[24]。

最后，在持续优化阶段，项目沟通管理聚焦于流程的不断完善与质量的持续提升。通过定期回顾与总结项目经验教训，管理层主导评审与流程优化工作，将质量管理指标

中国知网 https://www.cnki.net

融入项目管理实践，使之成为推动企业持续发展与高效沟通的关键驱动力[25]。这一过程不仅增强了项目沟通的有效性，还为企业文化的塑造与沟通能力的整体提升贡献了重要价值[26]。

项目沟通管理的成熟度模型是一个多维度、渐进式的发展路径，它深刻影响着项目的执行效率与最终成果[27]。在上述五个阶段中，每一阶段的跨越都代表着项目沟通管理能力的显著提升。特别是在全面管理实施阶段，不仅强调了沟通管理方案的正式性与执行力，还促进了跨部门、跨团队的沟通与协作，形成了更加紧密的项目共同体[28]。此外，持续优化阶段不仅关注流程与质量的提升，还鼓励创新思维与最佳实践的分享，为项目沟通管理注入了新的活力与动力[29]。通过这样的持续改进，企业能够不断提升自身在复杂多变市场环境中的竞争力，实现可持续发展。

2.2.2 阿吉里斯“不成熟-成熟“理论

哈佛大学杰出学者阿吉里斯在其著作《个性与组织》中，构建了“不成熟至成熟”的发展框架，这一理论为项目沟通技能与方法的优化提供了坚实的理论基础。阿吉里斯认为，初入企业的每位员工均处于某种程度的不成熟状态，即便某些员工拥有深厚的工作经验与卓越的个人能力，也需经历一段适应期，才能展现其岗位价值，确保个人成长与企业目标在不同发展阶段中的和谐统一[30]。根据成熟演变理论，沟通技能的精进同样遵循从不成熟迈向成熟的自然轨迹。在此过程中，个体的基本素质，尤其是教育背景与沟通能力，成为加速这一转变的关键因素。具体而言，拥有较高学历背景且熟练掌握沟通技巧的员工，往往能更高效地捕捉、整合并传递沟通所需的信息，从而在更短的时间内实现沟通效能的显著提升。这一观察强调了个人素质与沟通能力之间的正向关联，以及它们对于促进组织内部高效沟通、推动整体发展目标实现的不可或缺作用。在阿吉里斯不成熟—成熟理论下，员工所表现出的特点如下表 2.1 所示。

表 2.1 阿吉里斯 不成熟-成熟理论

Tab. 2.1 Achilles’s theory of immaturity-maturity

不成熟特点	成熟的特点
被动性	主动性
依赖性	独立性
办事方法少	办事方法多
兴趣淡漠	兴趣多
目光短浅	目光长远
从属的位置	自主的位置

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.1 续

Tab. 3.1 Cont

不成熟特点	成熟的特点
缺乏自知之明	有自知之明

注：数据来源于《个性与组织》

培训管理活动，作为企业项目管理体系的基石，其科学构建对于提升员工个人素质具有关键作用。贝克尔于 1964 年提出的员工培训管理模型，为行业内的培训实践提供了深厚的理论支撑。在当前竞争激烈的劳动力市场中，企业所设定的薪酬与福利水平，往往受到市场内其他企业边际生产力的影响，这要求企业在制定薪酬策略时必须全面考量市场竞争态势[31]。鉴于各企业边际产品调整具有同步性，导致工资与边际产品增量的趋同，企业需通过实施差异化的薪酬策略，以独特的吸引力汇聚行业内的优秀人才[32]。值得注意的是，在企业精心策划的培训活动中，员工不仅是参与者，更是直接且唯一的受益者。企业通过不断充实培训资源、优化培训体系，旨在促进员工业务素养的飞跃式提升。这一过程中，员工通过积极参与培训，不仅增强了自身的专业技能，更深化了对岗位的归属感和认同感。同时，企业的培训投资，作为一种战略性举措，能够有效助力员工核心竞争力的塑造，最终促成企业与员工之间双赢局面的形成，共同推动企业的可持续发展，促成项目的成功[33]。

2.2.3 组织沟通氛围理论

组织沟通氛围理论最初由 Reichers 和 Schneider 于 1990 年提出。该理论深刻剖析了工作环境中的整体沟通特性，这些特性不仅被组织成员所直观感知，还深刻塑造着员工在组织框架下的沟通行为模式。该理论框架涵盖了诸如组织公正性、成员归属感、沟通效率与质量、领导层的积极支持，以及员工间有效反馈等多个核心维度，共同构成了一个组织沟通生态系统。通过这一理论视角，我们得以深入理解沟通氛围如何作为一种隐形的力量，驱动着组织内部的信息流通、关系构建与绩效表现[34]。

组织沟通氛围理论的核心精髓可归纳如下：（1）构建透明开放的沟通平台。增强组织内的沟通透明度，让员工能够更直观地感受到组织的公正与公平，有效缓解因管理层与员工间沟通不畅所导致的潜在隔阂。企业应当积极营造一个鼓励平等对话、频繁互动的环境，以此为基础，促进项目成员间建立起积极正向的相互关系，进而加深他们对组织的归属感与承诺。（2）增强员工参与决策的深度与广度。企业应通过高效沟通机制，确保员工在目标设定、产品创新等关键领域拥有更多的话语权与参与机会，实现信息的全面共享与深度交流。此举不仅能让员工对组织战略有更加全面深入的理解，还能

中国知网 https://www.cnki.net

显著提升其组织认同感。此外，当员工意见被重视并纳入决策过程，或是其观点成功影响团队氛围时，其个人价值感与成就感将得到极大提升[35]。（3）深化情感沟通。企业应注重情感层面的交流，通过细腻的语言表达、适时的语气调整及恰当的称谓使用，展现出对员工的深切关怀与尊重，营造出一种充满社会亲近感的沟通氛围。同时，企业需通过有效沟通，深入了解员工需求与心理状态，传递组织对其能力与品质的信任，从而进一步增强员工的自我价值认知与归属感。

J 公司的员工大概有 30%以上为 90 后员工，90 后员工群体显著倾向于寻求一种自由且开放的职业环境，他们热衷于置身于充满活力与创意的交流平台之上，以增强跨部门与同事间的有效互动。此类员工不仅勇于在工作中发声，积极贡献自己的独到见解，还深切期望能在一个包容性强、富含人文关怀的企业文化中找到归属感，实现个人价值的最大化。同时，他们高度重视组织内部的沟通机制，渴望通过积极的交流渠道感受到来自上级及整个组织的深切关怀与高度重视，以此作为职业成长与激励的重要源泉。同时，该理论倡导营造一种支持性沟通文化，旨在激发员工自发沟通的积极性与主动性，从而推动沟通管理的实践深化与持续优化。因此，组织沟通氛围理论不仅是对沟通理论的深化探索，更是对沟通管理实践需求的精准回应与指导。

中国知网 https://www.cnki.net

3 J 公司开发项目沟通管理问题及成因分析

本章节首先通过对 J 公司、J 公司开发项目、J 公司开发项目沟通管理特点的介绍说明 J 公司的沟通管理现状，再运用相关实地调研法总结出 J 公司开发项目目前存在的主要沟通管理问题，即项目沟通计划的执行度差、团队成员沟通信息不准确、项目沟通方式不当、团队成员缺乏主动沟通意识。再运用第二章的相关理论分析出问题的成因，分别为：项目经理的权力和非权力领导力不足、团队成员专业知识和实践经验不足、沟通方式过于单一且沟通规划不完善、组织沟通氛围和沟通机制缺乏。

3.1 J 公司及其开发项目介绍

3.1.1 J 公司介绍

J 集团成立于 2010 年，专注于电池连接件的开发、生产和销售，其产品广泛应用于各类消费电子，产品种类具体包含：TCO 连接组件、Busbar 绝缘材料、精密冲压组件、锂电池连接组件，公司发展至 2020 年进入行业细分领域的前三。集团积极响应国家”碳达峰、碳中和“政策的号召以及对汽车行业整体发展前景的预估，自 2020 年便开始前瞻布局新能源电动车电池连接件产业，经过一年多的布局，于 2021 年收购某 S 公司成立新能源事业部，并于 2022 年年初分离该事业部单独成立子公司 J 公司。J 公司主营电动汽车锂电池连接部件、锂电池安全保护组件以及汽车高压配电系统的开发，拥有汽车行业多项资质认证，具备量产能力，其中笔者所在的事业单元专注于电动汽车锂电池连接部件即汇流排的开发和制造。J 公司作为新能源汽车行业的新兴企业，能否实现从 0-1 的突破决定着 J 公司未来的发展基础，每一个项目的成功与否都牵动着每个利益组织及利益相关方，项目的成功交付及公司营业额的突破是每个利益组织和利益相关方的共同目标。因此，公司的管理策略上也越来越重视项目管理。

J 公司组织架构相对完善，职能部门齐全。在 J 公司的组织架构中，根据负责产品种类的不同又分为不同的事业部，事业部内又有更细项的部门划分。本文所研究的项目是汇流排开发类项目，汇流排开发类项目归属于汇流排事业部管辖，下图 3.1 为汇流排事业部的组织结构图：

中国知网 https://www.cnki.net

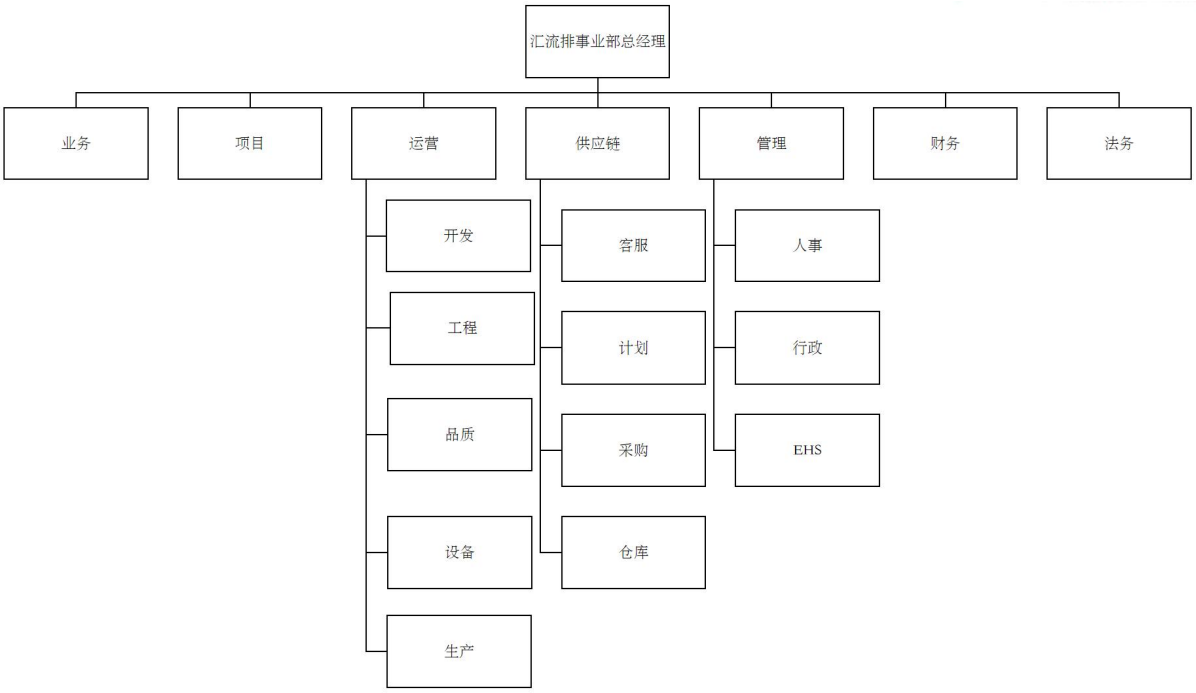

图 3.1 汇流排事业部组织结构图

Fig. 3.1 Busbar business unit organizational structure

注：数据来源于 J 公司内部资料

汇流排项目组织由项目经理和来自于各个职能组的成员组成，项目组织形式为弱矩阵项目组织，项目经理在其中更多承担的是项目协调者或者监督者的角色，而并非真正的管理者。下图 3.2 为汇流排项目组织图。

中国知网 https://www.cnki.net

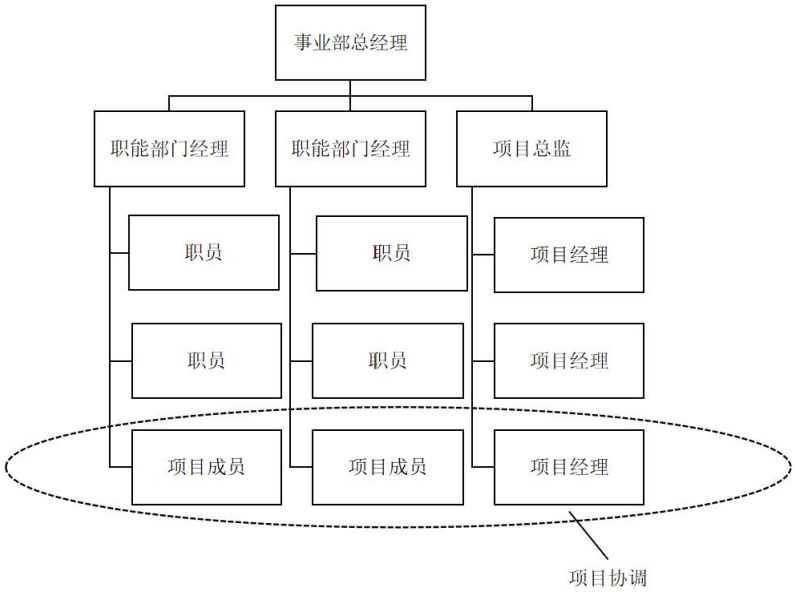

图 3.2 汇流排项目组织结构图

Fig. 3.2 Busbar project organizational structure

注：数据来源于 J 公司内部数据

在该组织中，项目经理为项目的全职人员，从其他部门抽调的项目成员均为兼职人员，该部分人员除了承担所在项目的相关事务，还要处理职能部门内由职能经理安排的其他事务。项目经理权责不对等，责任大权利小。从资源调配的维度审视，项目管理过程中，项目经理并不直接掌握资源的直接调配权，而是依赖于各职能部门经理作为中介，负责资源的具体调配与使用决策。这一机制下，资源的可用性最终由职能部门经理裁定，体现了跨部门资源调配的复杂性。从协作关系的层面分析，项目经理与项目组成员之间的关系呈现出临时性特征，与之相对，职能经理与其部下的项目组成员则维系着长期稳定的合作关系。由于项目组成员往往更重视个人长远的职业发展，他们更倾向于维护与职能经理的紧密联系，而非项目经理，这在一定程度上削弱了项目经理对项目组成员的直接影响力与控制力。从信息传递过程来看，项目管理中的沟通管理理想状态是项目组成员直接向项目经理汇报项目信息，以确保信息的及时性与准确性。然而，在实践中，项目组成员更倾向于优先向职能经理传递信息，这一行为模式导致了项目经理在获取信息时面临信息滞后与不全的风险，进而影响了项目管理的效率与决策质量，对汇流排项目的开发进度、成本、质量也造成了不同程度的影响。

3.1.2 J 公司开发项目沟通概况

汇流排（Busbar）是一种由导电材料制成的金属条或金属板，它承担着将电能从电

中国知网 https://www.cnki.net

池传输到电动机的关键任务。新能源电机汇流排是现代电动汽车中至关重要的组成部分。新能源电机汇流排通过高效的电能传输、优良的散热性能和稳定的结构支撑，确保电动车系统的正常运行和安全性能。根据其产品结构和形式，汇流排的种类可以分为三类，即扁平型汇流排、条状型汇流排、管状型汇流排。随着新能源汽车技术的不断发展，对汇流排的设计和制造也提出更高的要求。J 公司自 2021 年成立至今已完成大大小小超过 20 款以上的汇流排开发项目，目前仍有超过 5 款项目正在开发进行中，面对客户端日益严苛的交付标准和开发时间限制，汇流排项目组压力倍增，项目管理工作面临诸多挑战。

J 公司属于 OEM 企业，其项目数量比较多，但针对同一客户所委托加工的产品在工艺上往往有很多相似性，因此，在开发过程中，有很多知识、技术、设备和人员可以在一定程度上进行共享。人员的安排上，一般一个项目经理会同时负责多个项目，各个项目组员也会兼职多个项目。对于大部分 OEM 企业来讲，在激烈的市场竞争中主要以价格优势、制造能力取得订单，J 公司也不例外， J 公司属于汽车行业的新兴企业，利用国家政策优惠及时抢占市场为公司战略首要考量因素。因此在项目管理的过程中，迫于客户的压力、业务部门的压力及公司高层领导的压力，项目经理会格外重视项目的时间管理，客户在寻找 OEM 企业时，也会更多的侧重于考量 OEM 企业的准时交付能力。

在 J 公司的项目沟通管理中，以项目经理为沟通起始点向各团队成员进行信息的传递，各团队成员进行项目事项的沟通，项目日常的沟通以正式沟通为主，非正式沟通运用较少。由于沟通方式过于单一，经常出现信息传播速度较慢、信息处理的效率低等状况。在正式沟通模式下，信息由较高层级流向较低层级，项目组员都是信息的被动接受者，在组织内部容易形成权力氛围，组员很少主动反馈问题或想法，沟通的积极性也日趋下降，使得多数沟通仅停留在单向信息传递层面，未能实现真正意义上的双向沟通。

汇流排项目的开发涉及众多部门，从初始询价阶段客户需求的收集、方案的确认，新产品导入阶段工艺的验证到量产阶段产品的批量爬坡与交付，都离不开大量的沟通。在此过程中，沟通管理涉及不同阶段的各个职能单位的参与人员及项目相关方。项目内部的沟通包括与业务部、采购部、开发部、工程部、质量部、财务部等部门的沟通，项目外部的沟通包括与客户端的沟通、与各个供应商的沟通、与第三方检测机构或政府部门等的沟通，以及不同项目团队之间的沟通、与公司高层领导的沟通。正是由于项目涉及的部门繁多，各职能部门间职责划分清晰，部门成员往往深陷于本职领域的深耕，对项目整体事务的关注度不足。在汇流排开发项目中，项目经理是信息传递的起始点，项目成员从项目经理处接受信息，成员之间需要共同协作完成项目任务，但实际实践中成员间横向沟通匮乏，各自为政，仅聚焦于个人任务，忽略了团队的整体协作。此模式不仅导致重要信息被忽视，还催生了沟通障碍与不畅，进而削弱了团队内的沟通氛围与效

中国知网 https://www.cnki.net

率，对项目的推进构成了极大的阻碍。此外，项目组员还缺乏对信息的反馈意识，很多时候沟通只关注是否将信息传达出去，而没有去关注信息接受者的反馈，并不能称得上双向沟通。例如计划部人员将汇流排生产计划以邮件发送给生产人员，目的是让生产人员提前做好产线准备和物料准备，但是当产线人员发现生产线体有异常无法正常排产时并没有及时反馈给计划部人员，生产部人员想当然的认为计划人员没有看到回复就不会安排生产计划，而计划部人员认为生产部人员没有回复就代表产线和物料没有问题，直接将交货计划回复给项目经理，结果导致交货时间到了却交不出货的囧境。类似的事情还有很多，种种事项表明 J 公司开发项目沟通管理存在问题。

J 公司的开发项目沟通媒介主要以会议、电话、纸介质及网络沟通为主。项目内部的沟通情况具体如下：

会议沟通：从项目的初始询价阶段开始，通过一系列评审会议、审查会议、项目节点会议来沟通和跟踪项目的具体情况以及项目的最新进展。通常包括新项目可行性评审会议、项目启动会、技术讨论会议、项目周例会、质量评审会议、项目里程碑会议、项目总结会议等等。目的是通过会议的方式帮助项目成员了解项目的目标、任务，帮助项目经理掌握项目的最新进展和解决各种问题和冲突。J 公司的项目会议较多，项目组员往往同时负责多个项目，面对频繁的项目会议，成员往往应接不暇，因此经常出现项目沟通计划延期的情况。

电话沟通:对于项目执行过程中发生的一些较为紧急的突发的情况，为保证时效性，往往采取优先电话沟通的方式进行，此外，相关人员如果对项目的某一方面有个人的疑问不方便当面沟通时也会采取电话询问的沟通方式。

纸介质沟通：针对客户图纸、内部设计图、评审文档及合同文件等关键资料，内部纸质载体进行确认与交流。保障信息传递的准确性和可追溯性。

网络沟通：主要采用微信、邮件、腾讯会议软件等方式进行实时地沟通，并实现各种音频、图档、文档等的实时传输。

汇流排开发项目涉及众多部门，项目团队成员间需保持密集且频繁的跨部门交流，以确保信息的顺畅流通与协作的紧密无间。在此过程中，项目经理承担起至关重要的沟通管理角色，其所投入的时间占比超过项目总工作量的七成。J 公司汇流排项目的实际执行情况汇总各项目成员之间沟通的时间、频次及沟通方式如下下表 3.2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.1 J 公司汇流排项目沟通方式和沟通频率

Tab. 3.1 Busbar project communication channel and frequency

沟通工具	沟通时间	沟通频次
会议沟通	1 小时/次	周例会、月例会、项目阶段会议
电话沟通	1.5 小时/天	每天
纸质沟通	0.5 小时/天	每天
微信	2 小时/天	每天
邮件	2 小时/天	每天
腾讯视频会议	1 小时/次	每天

注：数据来源于 J 公司内部资料

由此可见，汇流排项目的沟通较为频繁。虽然频繁的沟通能够确保信息快速地被传递，提升信息处理的效率，但往往也容易造成员工疲于应付，项目会议流于形式，员工参会频繁迟到、汇报工作避重就轻的弊端。

在汇流排项目开发过程中，项目经理负责收集和整理项目各个阶段的实际进展情况，通过收集与整理各类进度、质量、成本数据，最终稿编纂成一份详细的阶段性报告，定期汇报给管理层。J 公司实施月度考核，人员的薪资待遇调整及职位的升迁都取决于 12 个月度的考核结果。汇流排项目组员的考核由各职能经理负责，最终的考核结果也是由各职能经理决定，虽然职能经理也会通过项目报告或者与项目经理确认其部下员工的项目表现，作为其考核的依据，但也仅仅是参考，在组员的绩效考核当中，项目经理没有任何实际的权重占比。项目成员在项目中的表现也因此而不受约束，对项目的有效开展造成了一定的影响。

3.1.3 J 公司开发项目沟通管理特点

汇流排项目沟通管理具有多元化、范围广、灵活性要求高、阶段性强、临时性强、紧迫性强、难度大的特点。

首先，汇流排项目沟通管理具有多元化的特点，在项目中，项目团队成员均来自不同的教育背景、家庭背景，各自所拥有的经验和工作职责也不相同，因此他们的沟通需求和方式也会有所不同。各项目组员需要针对不同的沟通对象，采用不同的沟通方式和工具，以满足对方的需求，促进信息共享和信息交流，达成沟通的目的。目前 J 公司的项目成员的受教育水平和经验水平层次不齐，针对新进员工，公司采用导师带徒制帮忙新进员工快速的适应工作环境和掌握工作内容。

其次，汇流排项目沟通管理流程多。例如项目早期询价流程，首先，由业务部门召开新业务可行性评估会议，对该新业务的可行性进行评估，评估完成后需要提交管理层

中国知网 https://www.cnki.net

审批。若可行，业务需要提交新业务可行性评估申请表提交至项目经理，项目经理组织团队完成可行性评估和风险评估，然后提交管理层审批。若项目可行，项目小组还要进行下一步报价工作。待报价完成，业务需要组织项目团队进行项目报价的评审，最终由管理层确认报价是否合理再由业务完成对客户的报价。汇流排项目的早期询价涉及众多评审和审批流程，每一个流程都需要与各个职能单位或管理层沟通，持续跟进评审和审批的进度，确保项目按照计划如期进行，以免造成项目延误、成本增加的情况。

此外，汇流排项目沟通管理还具有范围广的特点。汇流排项目的开发涉及内部众多部门和外部项目干系人，内部部门包括项目部、开发部、质量部、业务部、生产部、计划部、采购部，项目内外部的干系人包括客户、供应商、第三方测试机构、相关政府部门，众多繁杂的跨部门沟通给项目管理增加了极大的难度。

汇流排开发项目沟通管理难度大、汇流排项目沟通范围广等特点给项目沟通管理的工作带来极大的困难，对项目经理的团队管理水平也提出了更高的要求，更是对现有项目弱矩阵组织结构的挑战。为了确保能够达到沟通管理的目标，又能满足团队成员之间相互合作的需要，以及提升客户及公司管理层等项目相关方的满意度，项目团队需要完善的沟通管理机制，制定合适的沟通管理策略，切实做好团队沟通管理规划，积极营造适合沟通的团队氛围，过程中定期监督沟通管理计划的实施情况，提升项目团队整体的核心竞争力和项目管理的水平。

3.2 J 公司开发项目沟通管理存在问题

为了对 J 公司开发项目的内部沟通管理现状进行深入了解，本文采用实地研究法，通过查阅 J 公司过往项目案例，对 J 公司开发项目沟通管理存在的普遍问题进行识别。

J 公司开发项目团队总计 60 人，本研究总计收集 8 份新产品开发案例，根据对回收到的案例进行研究总结，共得出以下表 3.2 主要 10 条项目沟通管理问题。

表 3.2 J 公司开发项目沟通管理问题

Tab. 3.2 Communication management issues of J company development projects

序号	存在的沟通管理问题	认同人数	百分比
1	项目会议延期情况多	42	83%
2	项目沟通信息误差大	40	75%
3	组员的沟通积极性不高	38	63%

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.2 续

Tab. 3.2 Cont

序号	存在的沟通管理问题	认同人数	百分比
4	微信群聊多效率低下	36	60%
5	职能部门工作与项目工作冲突太多	30	50%
6	问题反馈渠道少	28	47%
7	内部沟通氛围不佳	28	47%
8	组员的配合度低	28	47%
9	沟通技巧缺乏	26	40%
10	项目成员经验不足	20	33%

注：数据来源于 J 公司内部资料

从这 10 条项目沟通管理问题的相互关系来看，每一个问题并非单独存在，而是互为影响。例如，职能部门工作与项目工作冲突太多，有一定程度会导致项目工作被延误。内部沟通氛围不好，自然会降低员工主动沟通的积极性。因此，针对这 10 条问题进一步归纳总结出 J 公司开发项目沟通管理所存在的四大主要问题即：项目沟通计划的执行度差、团队成员沟通信息失真、项目成员沟通方式运用不当、团队成员缺乏主动沟通意愿。

3.2.1 项目沟通计划延期频繁

J 公司的沟通计划的执行度较差，随机抽查了 6 个项目，汇总项目沟通计划的执行度情况如下表 3.3。通过表 3.3 可发现，J 公司的项目会议延期次数多，项目例会和项目紧急会议方面尤为明显。

表 3.3 J 公司项目沟通计划执行情况

Tab. 3.3 J company project communication plan execution situation

序号	项目会议类别	延期次数	延期占比
1	项目例会	62	65%
2	项目紧急会议	36	50%
3	技术研讨会	26	18%
4	项目质量例会	30	20%
5	项目评审会	10	28%
6	项目变更控制会议	5	28%

注：数据来源于 J 公司内部资料

中国知网 https://www.cnki.net

在各个项目开发的初期阶段，由于会议安排相对稀疏，参与者尚能保持较高的准时率。然而，随着项目深入，实施过程中出现诸多挑战，促使项目负责人不得不调整会议策略，将项目会议频次从原先的每周一次显著提升至每周二至三次，甚至有时候需要单日内连续召开两次会议，以应对日益复杂的项目问题。

遗憾的是，这一决策调整过程中，部分项目负责人未能充分预见其对团队成员日程安排的影响，未及时与所有成员进行有效沟通，而是直接通过会议预订系统发送了即时通知，且有些通知往往距离会议开始不足一小时才送达。鉴于团队成员分散于不同部门，各自承载着繁重的部门工作负荷，此类仓促的通知不仅导致了频繁的迟到现象，还引发了广泛的不满与抱怨。

随着时间的推移，这种非正式的会议通知习惯逐渐固化，迟到行为变得司空见惯，进而严重影响了会议的效率与秩序。会议开始时间常常被迫延后，原定半小时的议程屡屡遭遇延长，严重干扰了项目管理的节奏与效果。

针对提前预约的沟通，也经常因为沟通人员被本职能部门经理的临时抽调而中断，导致会议不得不中断或延迟进行，沟通缺乏连续性和一致性。而面对这种情况，项目经理也没有任何惩治权利，只能先尽力与项目组员或者职能经理协调，整个沟通过程耗费大量的时间和精力，项目的整体进度也因此而受影响。

针对 J 公司的项目紧急会议方面，一般电话或者面对面会议被认为是处理紧急事项的最优和最及时的沟通方式，但通过深入实地调研却发现，很多紧急事项都是用邮件在沟通，从而影响了事情处理的效率，造成客户端不满。例如，在 A 项目的 B 样阶段，客户提出变更设计的需求，需要 A 项目组在 24 小时内回复设计变更的可行性、旧物料库存状况和新物料的导入时间。项目经理在收到客户消息的第一时间就电话召集相关成员召开紧急会议，要求相关人员参加会议部署相关事项。电话沟通完成之后，项目经理通过邮件发布了会议通知，但仅有 2 名成员接受了会议邀请，其他未反馈成员待项目经理找到他们时，有一部分人反馈还没看到信息，还有一部分人反馈他们手头有其他事情在处理，无法参加会议，工作内容有冲突，让项目经理把需要做的事项邮件发送即可，时间空了会处理。整个过程沟通下来发现，没几个人能参加会议，大家都以工作冲突为由直接拒绝或者推诿或者拖延时间。待项目经理晚点找他们确认结果时，却发现某些成员在参加其职能部门的会议，导致事项被搁置。还有些成员反馈手上其他事项还未完成，需要晚点再给回复。最终未能在 24 小时内回复客户，导致客户不满投诉至业务总监处。除了临时的设计变更之外，客户还经常提出临时又紧急的交期需求，虽然很多时候客户的要求几近苛刻，但考虑到B客户和T客户为行业头部企业并且是公司的重点战略客户，项目经理不得不妥协。但项目经理往往又无法有效推动内部团队实施，团队成员经常以

中国知网 https://www.cnki.net

工作冲突为由拖延或者推诿，项目经理不得不与其或者其领导反复沟通，大大降低了项目的执行效率和执行效果。下表 3.4 总结了 J 公司开发项目紧急突发状况的项目数及影响。

表 3.4 J 公司开发项目突发事件统计

Tab. 3.4 J company development project emergency statistics

类别	2021	2022	2023
总项目数量	4	8	12
突发事件	3	4	6
沟通管理不及时导致的事态升级	1	2	4
占比	33%	50%	67%
造成的影响	客户投诉	项目延期；客户投诉	项目延期；订单减少

注：数据来源于 J 公司内部资料

3.2.2 团队成员沟通信息失真

信息失真就是信息在传递过程中失去了真实性，到达信息接收者时与从信息者发出时是不一样的。J 公司项目组成员在进行项目信息的沟通时，经常存在信息失真的情况。下图 3.3 展示了 J 公司项目组在沟通过程中发生的信息失真的总体情况。

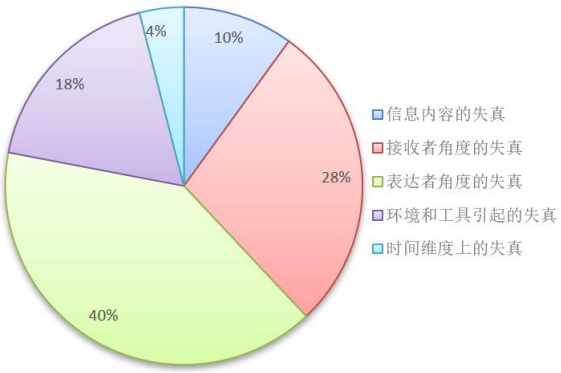

图 3.3 J 公司项目信息沟通失真情况

Fig. 3.3 Information communication distortion of company J’s project

注：数据来源于 J 公司内部资料

从图 3.3 可以看出，J 公司项目组的信息失真问题主要存在于接受者和表达者角度的失真。通过对接收者和表达者角度的信息失真进一步剖析，总结出如下两类信息失真

中国知网 https://www.cnki.net

问题：

第一类，非技术人员作为信息接收者和表达者的信息沟通失真。例如，项目经理和业务经理作为项目组对外的主要沟通代表，在与客户端的技术人员沟通时，客户经常会提到一些技术类的专业词汇，这些词汇对于技术人员也许不陌生，但是对于没有任何技术背景的项目经理和业务经理来说，理解起来非常困难，有的人不清楚会直接问，但大部分碍于面子的原因，也不细问，最终导致对客户所传达的信息理解错误或者压根没理解，再由项目经理或者业务经理将客户信息传达至内部团队时，信息已经失真，所传达的信息已经不是客户当初所想表达的。

第二类，新进员工作为信息接收者的信息沟通失真，此处的新员工指的是入职 J 公司不足半年时间的员工。J 公司初期为了节省成本，招聘了一部分刚毕业的大学生，J 公司的新员工就是以这部分大学生为主。在项目组的人员占比中，新员工的比例占 15% 左右，公司为了让新员工能够迅速适应企业的工作节奏以及快速理解和吸收相关的专业知识，为每个新员工都安排了相应的导师，由导师对其进行一对一的指导与考核，但由于导师都是选的经验丰富的老员工，老员工工作也较繁忙，很多时候自己的工作都无暇顾及，更没有时间去辅导新员工，久而久之，导师制也流于形式。新员工只能靠自己摸索，边学习边进步。学习需要时间和过程，在这个过程中，由于专业知识及工作经验的缺乏，常常导致新员工在面对项目信息的解读和传递方面存在误差，对于项目中发生的问题，往往不能第一时间表达清楚，对于别人提出的问题，也不能快速的处理和解决，最终给项目组造成极大的困扰。

3.2.3 项目成员沟通方式不当

项目沟通方式多种多样，有正式的和非正式，横向的和纵向的，口头的和非口头的等等。从 J 公司的项目沟通计划可以看出，J 公司以正式沟通为主，非正式沟通为辅。其中正式沟通又以邮件和腾讯会议为主，非正式沟通以个人微信沟通为主。但往往项目组成员在项目沟通过程中，没有根据沟通环境和沟通事项选择合适的沟通方式，造成了项目沟通的结果不达预期，从而影响了项目的进展。

微信群聊被 J 公司项目组在项目执行过程运用较多，很多时候连一件小事情都会建立一个微信沟通群，据调查，每个项目成员的微信里至少有 40 个以上的微信群聊，每天微信群聊的信息能达到几百条，只要一会儿没看微信，微信群的未读消息就能达到大几十条。随机抽查 8 个项目总计 8 位项目成员的微信群聊情况如下表 3.5：

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.5 J 公司项目组成员微信群聊情况

Tab. 3.5 J company project team members wechat group chat

项目成员	微信群聊总数	1 小时内未读信息	截止当日未读信息
A	62	80	120
B	51	39	69
C	46	40	80
D	49	39	65
E	80	120	116
F	65	32	68
G	62	58	98
H	46	42	35

注：数据来源于 J 公司内部资料

J 公司的项目微信群聊有几大特点。第一点，微信群的消息通知频繁，导致微信群中的信息流动和覆盖非常快，尤其是在团队成员较多时，信息的频繁发布导致接收者接受大量的通知，无法及时筛选或处理有用信息。第二点，微信群信息层次混乱，比如重要的项目进展、任务分配、日常闲聊等，都在群里发布，由于这些信息都混杂在一起，常常导致项目成员难以区分重要与次要内容。第三，重复性信息太多，比如领导发布一条消息，下面几十个人点赞或者发微信表情包表示收到，同样的信息被多次回复，导致重要信息被大量无关内容淹没。

微信群聊的信息过多，手机的微信信息提示一直响个不停，群聊信息层次混乱，太多无效信息，极大的影响了成员的工作效率。基于此情况，有些成员就直接把微信群聊设置成免打扰的模式，这就导致群里面发布与该成员相关的消息时，该成员也无法及时查阅。有些微信群聊群主也没有设置群聊名称，导致日后查阅历史信息非常困难。微信群聊这种沟通方式让项目组成员烦恼不已，若逐条查阅微信群聊内容，又发现很多都是无效内容，很多事项并非与自己息息相关，浪费时间；若不看微信群聊，又怕错过和自己有关的重要内容。

微信群聊这种沟通模式，看似可以使成员之间实现快速沟通，打破时间和空间的限制，使得信息能够随时随地的传递。但如若使用不当，会导致信息交流过程中产生干扰因素，让成员无法关注其中和自己有关的有用信息，反而会阻隔信息的传递。

3.2.4 团队成员缺乏主动沟通意愿

调查数据显示 J 公司项目成员普遍缺乏主动沟通的意识，在项目执行过程中很少采取主动沟通的方式，而是被动等待询问。J 公司成员缺乏主动沟通意识主要体现在如下

中国知网 https://www.cnki.net

几个方面：

一是项目成员几乎不会进行上行沟通。通过进一步深入了解得知，J 公司项目组很多领导都是“一言堂”，各部门之间利益斗争非常激烈。项目成员作为下级，往往处于弱势地位，所提出的想法和建议往往不会被采纳，甚至可能会遭受领导的言语攻击，无行中拉远了项目成员与上级领导的沟通距离。例如，在某汇流排的开发过程中，因客户的需求输入变更，导致产品设计需要变更，项目经理需要基于此变更费用追加项目开发预算。项目经理按照以往流程惯例，将变更询价发给采购来收集变更成本。3 个工作日过后，项目经理仍未收到采购的成本回复，经过项目经理的当面询问才得知，现在的产品开发成本、变更成本、单价成本全部由财务部门提供，采购不直接对接项目经理。该决策由运营副总裁所决定，但通过与采购领导的沟通得知，采购领导不理解副总裁这么做的原因，只是觉得副总裁不信任采购部门。项目经理随后又联系了财务部门，但财务部门给出的反馈是流程虽然规定了财务部要提供成本信息，但新流程还未开始执行，距离流程正式启用还有半个月的时间，且财务同事也一直在抱怨为什么这个成本要让财务提供。项目变更在即，项目经理在群里主动@部门总监&副总裁，将此事汇报并建议在此过渡阶段还是由采购部门先提供，结果副总裁对于项目经理所反馈的困难和建议视而不见，仅仅回复“财务提供”四个字。这直接导致项目经理产生了“提了建议也没用“想法，久而久之，主动上行沟通的积极性也随之降低。后续再面对类似的事件时，项目经理也不愿意主动进行上行沟通，而是被动执行领导的要求。

二是 J 公司项目组被动式沟通盛行。例如，项目组在日常的物料采购中，所有决策权均未下放给相关岗位的员工，小到一颗标准件的采购，也需要高层领导最终决策品牌与数量。若是采购总金额超过 1000 元，甚至要签核至公司的最高层领导总经理。在此情境下，项目成员逐渐习惯于消极沟通，只要管理者不做指示，他们便不敢向前迈出一步，更不愿意主动向管理者咨询工作上的疑问。如此环境下，员工的被动沟通愈发普遍，而管理者因事必躬亲，亦无瑕顾及与员工交流，结果导致被动式、躺平式的沟通文化在 J 公司组织内部占据主导地位。

三是 J 公司项目组成员抵触式、防御式沟通过多。项目成员总是在事情发生后互相指责，互相推卸责任，部门领导对项目成员也是批评指责多。例如在汇流排 C 开发项目的试产阶段，客户提出想要变更一颗物料来节省整体产品成本，虽然之前已经做过相关验证实验，也小批量生产过 100 套，但在正式批量投产前，客户要求再生产 1000 套以确认其产品的功能和工艺的稳定性。试产投产时间定为 2023 年 8 月 5 日。小李是物控人员，负责新物料的下单和跟踪物料在 8 月 4 日下班前到达产线。小赵是生产主管，负责在 8 月 4 日下班前开具 1000 套的试产工单，跟进小李的物料实际到料时间。2023 年

中国知网 https://www.cnki.net

8 月 5 日上午 9 点 30 分左右，一名生产人员及时触发了生产异常预警机制，指出存在一个问题：原计划投产的 1000 套试产所需物料未能如期投入生产线，根本原因在于新物料的到位时间滞后于预警发出之时。小陈通过微信群向小李提出质疑，指责其未能有效确保物料及时送达生产现场，进而引发了对生产线停机和人员工时浪费的担忧，并表示这些后果应由小李负责。面对指责，小李在微信群中作出回应，他并未直接接受指责，而是转而询问小赵，为何在安排生产工单前未能与他充分沟通确认物料的预计到料时间，以此作为反驳的论点，表明自身并非造成此次异常的直接原因。2 人就在微信群聊里你一言我一语争吵不休。随后事件升级至小李和小赵的部门领导处，两位领导均对其成员进行了严厉的指责和批评，并告知扣除当月绩效。小赵是公司的“老油条”，对这样的结果感觉无所谓。但小李的自尊心因此而收到了伤害，在后续的沟通中他也采取更为消极的沟通方式。

从以上的种种案例不难看出。J 公司的项目成员与领导之间缺乏信任感，公司领导在面对员工的建议和反馈时缺乏足够的理解和耐心，没有能够做到换位思考。直接打击了员工主动沟通的积极性，降低了项目成员对领导者的信任。在处理诸如进度延误等挑战时，团队成员往往倾向于避免采用更为迂回或间接的沟通策略，或是运用更有效的沟通技巧，而是直接陷入争论之中，相互推诿责任，这种直接的冲突非但没有解决问题，反而加剧了沟通环境的紧张氛围，不利于问题的有效解决和团队协作的顺畅进行。项目组内的冲突不能够得到及时化解，造成组织氛围不融洽，其他成员看到这种情况，也不愿意主动沟通了。缺少了沟通氛围，每个人似乎都对主动沟通产生了一种畏惧。长此以往形成恶性循环：沟通氛围缺乏--沟通意识淡薄--不沟通—沟通氛围缺乏。

3.3 J 公司开发项目沟通管理问题成因

针对 J 公司的沟通管理问题，采用根本原因分析法、鱼刺图分析法，对产生的问题追本溯源，并依据沟通管理影响因素及跨部门沟通障碍因素从沟通主体、沟通环境、沟通构成三个维度进行问题的原因分析，如图 3.4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

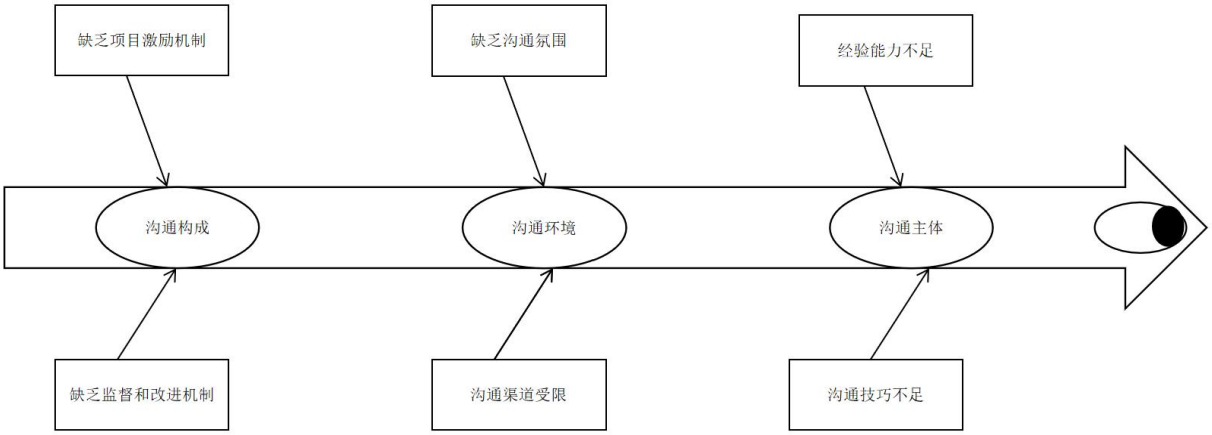

图 3.4 J 公司项目沟通管理问题成因汇总示意图

Fig. 3.4 Summary diagram of the causes of J company ‘s project communication management problems

注：数据来源于 J 公司内部资料

3.3.1 沟通计划缺乏制度化保障

结合项目沟通管理成熟度模型，列举 J 公司项目组沟通管理成熟度情况如下表 3.6，研究后得出 J 公司项目沟通管理目前还是处于结构化构建阶段。

表 3.6 J 公司项目沟通管理成熟度分析

Tab. 3.6 J company project communication management maturity analysis

级别	J 公司项目沟通现状	所属成熟阶段
沟通计划	有建立沟通计划	初始过程
信息发布	通过正式邮件或者会议的方式进行信息发布	介于结构化构建和制度化过程之间
绩效报告	没有实行绩效考核，仅由项目经理输出简易的项目阶段性总结报告	结构化构建过程
问题跟踪和管理	针对出现的问题有初步的跟踪记录和简易的文档更新发布	改进和优化过程

注：数据来源于 J 公司内部资料

J 公司各项目都建立了项目沟通计划，下表 3.7 为 J 公司开发项目的沟通计划表。从表中可以看出，J 公司开发项目会议较多且会议的频率较为频繁，其中各种技术研讨会、临时性会议的沟通频率为随时，沟通时间不定时。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.7 J 公司开发项目沟通计划

Tab. 3.7 Communication plan of J company development projects

沟通活动	沟通渠道	沟通频率	主持人	参与者
项目启动会	邮件/面对面会议	一次	项目经理	项目组成员
每周例会	面对面会议/腾讯会议/邮件	每周	项目经理	项目组成员
每日检讨会	面对面/腾讯会议/邮件	每日	项目经理	项目组成员
项目阶段性会议	面对面/腾讯会议/邮件	阶段性	项目经理	项目组成员
各种研讨会	面对面/腾讯会议/邮件	随时	各责任人	项目组成员
测试开发讨论会	面对面/腾讯会议/邮件	每天	开发经理	项目组成员
紧急临时会议	面对面/腾讯会议/邮件	随时	项目经理	项目组成员

注：数据来源于 J 公司内部资料

虽然 J 公司各项目都建立了项目沟通计划，项目组对沟通计划的实行情况也做了简易的记录，但由于缺乏系统性的追踪和改善，导致沟通计划形同虚设，屡屡执行不到位。且组织内部也未针对各个项目进行绩效考核，仅对职能部门有考核，J 公司项目成员的绩效考核权 100%在于职能经理。在项目管理中，若缺乏对绩效的精准测量与深入分析，便难以获取项目有效的成果反馈，进而无法明确评估项目的运作效率与执行成效。特别是当项目遭遇挑战或问题时，若缺乏持续的问题追踪与管理机制，其对组织全局的潜在影响将难以预判。如果没有专门的制度去跟踪沟通计划的执行情况、收集反馈并进行调整，沟通中的问题（如信息失真、反馈延迟、执行不到位）可能无法及时发现和解决，从而导致计划执行时缺乏纠偏措施，久而久之执行度会逐步下降。如果项目中没有设定因沟通不到位所要承担的惩罚，或者未能通过奖励机制来鼓励高效沟通，团队成员可能会缺乏足够的动力去严格执行沟通计划[36]。沟通计划的执行依赖团队的积极性和责任感，缺乏制度化的奖惩机制会让沟通行为变得松散，不可约束。J 公司目前不仅缺乏对项目沟通计划的有效监督和反馈机制，而且对项目的绩效考评也是空白。由此可以得出，J 公司项目沟通管理缺乏有效的沟通制度的保障，从而导致整个沟通过程一直处于低效运行，沟通计划执行情况不达预期。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.2 部分项目团队成员实践经验少

开发过程本质上是个人知识积淀、实践经验融合与既有信息创新的过程，它构成了新信息的生成与塑造。在这一过程中，因个体间知识广度、经验深度及责任分工的差异，常导致对同一事物的理解分歧，进而阻碍共识的达成，导致沟通不畅[37]。此类沟通障碍的根源，多源自于沟通双方或多方在认知层面上的局限，具体表现为对沟通信息的接收、理解及传达存在不清晰、不透彻之处。此认知障碍深植于个人的教育背景、实践历程及知识体系的构建之中，成为影响有效沟通的重要因素。

下表 3.8 为 J 公司成员的基本信息状况。从该表可以看出，J 公司项目组成员的受教育水平和知识经验水平存在较大的差异。从受教育程度来看，有 40%左右为大专学历，约 60%为本科及以上学历。从工作经验来看，20%的成员在 J 公司有 1 年以下的工作经验，48%的人有 3 年左右的工作经验，此外还有 32%的人为 5 年以上工作经验，由此可以看出汇流排项目组整体成员的知识水平和经验能力参差不齐，3 年及 3 年以下工作经验的居多。

表 3.8 J 公司开发项目成员基本信息表

Tab. 3.8 J company project members basic information

内容	数据	人数	比重
性别	男	34	57%
	女	26	43%
年龄	20-30 岁	26	43%
	31-40 岁	28	47%
	40 以上	6	10%
学历	大专	18	30%
	本科	32	53%
	研究生	10	17%
工龄	1 年以下	9	15%
	1-3 年	32	53%
	3 年以上	19	32%
参与项目个数	3 个以下	20	33%
	3-5 个	28	47%
	5 个以上	12	20%

注：数据来源于 J 公司内部资料

根据阿吉里斯的“不成熟-成熟理论”，任何员工来到一家企业，都会经历从不成

中国知网 https://www.cnki.net

熟到成熟的状态。项目团队成员的沟通行为受其个人成熟度的影响，如果成员处于不成熟的状态，沟通可能会产生信息失真问题，而成熟的成员更能准确地传递和接受信息。不成熟的团队成员通常依赖上级或他人指示，缺乏主动性。这类成员在项目沟通中往往不敢表达自己的真实想法，或是怕犯错而选择隐藏信息，导致信息传递不准确或不完整。例如，J 公司项目经理和营销经理在与客户的技术人员沟通时，并未理解客户的真正需求，但是由于害怕被认为能力不足，因此即使没明白客户的需求也不会主动询问或者不澄清，从而导致在对内部信息传达时，信息失真。不成熟的成员信息处理和分析能力也较为欠缺，容易受到外界因素的干扰。他们在接受和传递信息时，可能无法准确地理解要求或者信息内容，或者只能理解部分信息，从而导致信息在传递过程中的失真。例如，J 公司项目组中工作年龄较短的刚毕业的大学生，由于其刚进入企业，对企业的各项工作还处于摸索中，是处于不成熟的状态，因此在面对项目问题时，无法第一时间分析和处理问题，最终给项目执行带来一定的风险。

J 公司汇流排项目组整体成员的知识水平和经验能力差异较大，整体工作经验都偏短，尽管部分员工拥有丰富的工作经验与较强的个人业务能力，然而，鉴于企业间的独特性与差异性，这些员工往往需要经历一段在特定企业环境中的适应期，才能充分展现其岗位价值及胜任能力。因此，J 公司的项目部分成员尚处于不成熟的状态。

贝克尔的员工培训管理模型指出，可以对企业内部不成熟的员工进行相关的培训。该模型指出，如果员工在基础沟通技巧、信息处理能力、批判性思维等方面的通用能力较弱，容易在接受或传递信息时产生误解。这种技能不足可以通过通用培训来提升。此外，针对需要特定的专业知识和技能的工作，比如内部流程、技术工具、产品知识等内容，若员工没有接受充分的专门培训，也将导致员工无法准确理解与企业或者项目特定运作方式的相关信息，从而导致信息在传递的过程中被扭曲和误解。

J 公司推行的“导师带徒“制可以帮助员工快速理解产品的相关专业知识、丰富项目的实践经验，使员工从不成熟状态渐渐转变为成熟状态。但实际运行过程中，“导师带徒“制流于形式，并未发挥真正的作用。因此这部分工作经验偏短的员工因在本企业的工作经验欠缺，在沟通上难免因为对信息理解不透彻或者理解错误而导致沟通信息失真。此外，J 公司也尚未建立通用培训课程，没有根据项目沟通管理的需要增设诸如沟通技巧、跨部门沟通、客户沟通与服务沟通之类的培训。因此，”不成熟“的项目成员也无法通过此类方式快速提升在企业中的“成熟度”，只能依靠自己摸索。

3.3.3 项目沟通方式的规范不清晰

《卓有成效的管理者》的作者彼得.德鲁克认为，如果一个管理工具把大家的时间变得越来越碎片化，使组织成员无法集中精力完成自己的工作，那么它一定不是一个好工

中国知网 https://www.cnki.net

具[38]。随着现代化信息的快速发展，项目沟通所采用的形式也更加的灵活多变，越来越多的传统信息沟通方式正在被现代信息通讯工具所取代。但现代通讯工具的应用，也使得项目沟通管理产生了一些问题。候任泉指出在新媒体环境下，采用即时通讯工具进行项目沟通管理也会导致信息噪音等沟通管理的障碍，需要从沟通环境的营造、管理者沟通观念的转变以及制定适宜的沟通管理规范等三个方面来提高沟通管理水平[39]。

结合 2.2.1 中所述的项目沟通的路径，我们可以看到在信息发送者和信息接收者之间还有媒体、噪音和反馈的存在[40]。传播内容通过信道，从传播者传递到受众者那里去，在这个信息传播的过程中，就会出现噪音。这个噪音，它不像信息那样，不仅不能消除不确定性，还会带来一些负面的干扰。J 公司在进行微信群的信息交流时，成员在群内的沟通过于随意，发布的信息模糊且含有大量无关或者不明确的内容，导致信息在传递的过程中产生了太多的噪音，降低了信息传递的效能，致使成员难以提取有价值的部分。

J 公司微信群聊中未对群聊信息进行结构化分类，项目进展信息、任务分配、重要信息、次要信息、项目问题讨论都混杂在一起。在这种情况下，每条信息都有不确定性，多个成员同时发言且信息来源不一致。信息源越多且信息的内容、结构差异越大时，信息熵会大幅上升。接收者无法快速判断哪些信息是关键的，哪些是次要的。

J 公司未明确哪些内容可以在微信群内发布、哪些内容不可以在微信群内发布。微信群聊中的闲聊、表情包、重复的点赞信息、无关的讨论，都增加了信息的冗余性和随机性，使得重要的信息被掩盖。这些无关的信息虽然在个体发言时对某人有意义，但对整个项目群组来说，他们增加了接受信息的不确定性和噪音。

J 公司未对微信群聊的信息进行结构化分类、未对信息的发布进行有效规范，正是项目沟通方式规范不清晰的具体表现。组员在使用个人微信沟通工作事项时，无相关准则和管理规定可遵循，导致沟通过于随意，沟通过程中噪音不断，沟通效果不达预期。

3.3.4 组织缺乏健康的沟通氛围

基于组织沟通氛围理论，项目组织沟通氛围指的是在项目团队内部关于如何进行沟通的整体文化和环境。这种氛围可以受到多种因素的影响，包括领导风格、团队成员的沟通习惯、公司的价值观、开放性程度以及对错误和反馈的态度。项目组织的沟通氛围直接影响员工的主动沟通意愿[41]。一个健康、开放、透明的沟通氛围能够激发员工的积极性，促进团队协作和创新，进而推动项目的成功。反之，一个封闭、权威、缺乏支持的沟通环境会抑制员工的沟通意愿，导致潜在问题被忽视或无法及时解决，从而影响项目的进展和团队的凝聚力。

J 公司项目成员的上下级之间以及同事之间缺乏信任和理解，导致沟通过程往往显得尤为谨慎和紧张。尤其是当问题发生后，批评与指责的声音占据主导地位，而赞赏与

中国知网 https://www.cnki.net

鼓励鲜有回响。随着时间的推移，成员的自信心会收到侵蚀。同时，员工因为担心在沟通过程中自身的利益会遭到损坏或者影响人际关系的和谐，往往会在沟通中采取沉默或者对抗的态度，最终演化为一种防御性且具反击性质的沟通方式，这种现象逐渐形成了负面的沟通文化。此外，成员之间都是因为项目而临时组合在一起，彼此之间并不是非常熟悉，加之平时也没有类似团建的这种非正式活动，因此在平级的沟通中，因缺乏合作和信任的基础，导致沟通时大家都有抵触情绪，采取防御式的沟通，问题非但没有得到解决，沟通氛围也进一步恶化。

项目经理向营销副总裁提出的反馈也未被采纳，而且项目经理与副总裁的整个沟通过程也显得非常压抑。在一个反馈得不到领导的支持甚至被压制的环境中，员工会逐渐失去主动沟通的动力。他们会认为即使提出问题或建议也不会有任何改变，因此选择沉默或者被动地接受现状。这种情况会导致问题得不到及时解决，影响项目的成功和团队整体的士气。

综上所述，J 公司的领导在处理异常问题时，未体现以人为本的精神，总是一味的批评和指责员工，员工因此而无法获得归属感和安全感。员工提出的建议也没有被领导采纳，种种举措将员工的参与感消磨殆尽，平级之间也缺乏互相了解，在合作的过程中，过于保护自我，缺乏信任的基础。由此可见，J 公司在成员归属感、领导层的积极支持及员工间的有效反馈方面表现欠佳。结合组织沟通氛围理论，J 公司所缺乏的这些恰恰是构成组织健康的沟通生态系统的关键因素。J 公司这种封闭、权威、缺乏支持的沟通环境会抑制员工的沟通意愿，导致潜在问题被忽视或无法及时解决，从而影响项目的进展和团队的凝聚力。

中国知网 https://www.cnki.net

4 J 公司开发项目沟通管理改进策略

前一章提出了 J 公司项目沟通管理所存在的问题，并且结合项目管理相关理论对问题的成因进行了逐一分析，找到了导致项目沟通管理问题的原因所在。本章节基于第二章的理论知识及第三章的成因分析结果，提出改善 J 公司汇流排项目沟通管理问题的一系列措施，改进策略遵循理论结合实际、低成本可实现的原则，以改善 J 公司汇流排项目沟通管理的现状，提高项目的沟通效率。

4.1 完善项目的沟通管理制度

4.1.1 建立项目沟通管理的监督和持续改进机制

监督机制是确保项目沟通管理活动按照既定计划和标准执行的关键环节。J 公司的监督机制可以参照如下流程来制定和执行。

首先，应要明确监督职责，明确监督职责则包括设立监督角色和界定监督范围。在项目团队中明确设立监督员或指定项目经理作为监督负责人，负责监督沟通管理活动的执行情况。明确监督员或项目经理的监督范围，包括沟通计划的执行、沟通渠道的有效性、沟通反馈的及时性等。

其次，要定期监控和评估，包括制定监控计划、执行监控活动、评估沟通效果。J 公司应根据项目特点和沟通管理需求，制定详细的监控计划，明确监控的时间点、监控内容、监控方法等。按照监控计划执行监控活动，收集沟通管理活动的相关数据和信息，如会议记录、沟通反馈、问题跟踪等。对收集到的数据进行分析和评估，判断沟通管理活动的执行效果是否达到预期目标，是否存在问题和不足。

此外，还要建立预警机制，包含设定预警目标和触发预警响应。根据项目特点和沟通管理需求，设立合理的预警指标，如沟通延误率、反馈响应及时率、问题解决率等等。当监控到沟通管理活动达到预警指标时，立即触发预警响应机制，启动相应的应对措施，防止问题扩大或影响项目进展。

最终还要对监督的结果进行记录和报告，包括记录监控结果、编制监控报告。监督员或项目经理应详细记录每次监控活动的结果和数据，包括发现的问题、采取的措施、改进的效果等。定期编制监督报告，向项目团队和相关利益方汇报沟通管理活动的执行情况和监督结果，以便及时发现问题并采取措施。

除了对项目执行的效果进行监督，还要对不足的部分进行持续的改进，目前 J 公司的沟通管理缺乏持续改进的机制，建议参照如下流程来制定和执行。

首先，需要对项目执行的情况进行定期的回顾和总结，包括组织回顾会议、分析问

中国知网 https://www.cnki.net

题和不足、提炼经验教训。在项目每个阶段结束后或定期（如每月、每季度）组织回顾会议，对沟通管理活动进行全面回顾和总结。在回顾会议中，分析沟通管理活动中存在的问题和不足，如沟通渠道不畅、沟通计划未及时调整、成员反馈不及时、问题解决效率低等，总结沟通管理活动中的成功经验和失败教训，提炼可以复用的沟通管理方法和技巧。

其次，需要制定改进措施，包括针对问题制定措施、明确改进目标和责任人。根据回顾和总结的结果，针对发现的问题和不足制定具体的改进措施。为每项改进措施设定明确的目标和责任人，确保改进措施得到有效执行。

此外，还需要实施改进措施，包括执行改进措施、跟踪改进效果。按照制定的改进措施进行执行，确保改进措施得到有效落实。对改进措施的执行效果进行跟踪和评估，确保改进措施达到预期效果。

最终，还需要在现有基础上持续优化，包括建立持续改进机制、引入新技术和方法。将沟通管理活动的持续改进作为项目管理的常态工作，不断寻求新的改进机会和方法，关注行业内的最新技术和方法，积极引入适合项目特点的沟通管理工具和方法，提高沟通管理的效率和效果。

通过以上监督机制和改进机制的建立和实施，可以确保 J 公司项目沟通管理活动的顺利进行和持续改进，提高项目沟通管理的整体效果。

4.1.2 建立项目绩效考核机制

J 公司汇流排项目沟通管理过程中出现项目经理资源协调困难，跨部门沟通障碍、组员的配合度差等问题，其中关键原因之一是项目缺乏有效的项目绩效考核机制，项目成员无论表现好坏，最终在工资体现上没有差别，组员的薪资福利和绩效都是由其所在的职能部门经理所决定的，与组员在项目中的表现不直接挂钩。这种不合理的绩效考核激励机制严重影响了员工的积极性和工作的配合度。心理学家詹姆斯的研究揭示了激励机制对员工潜能的显著影响：在固定薪酬制度下，员工往往仅能展现其能力的约 20%至 30%，而一旦受到恰当的激励，其能力释放可跃升至 80%至 90%之间，即激励后的能力发挥几乎是未激励状态下的两到三倍。鉴于此，为了有效提升汇流排项目组成员的工作积极性、工作配合度，并减少跨部门间的沟通壁垒，构建一个科学合理、旨在促进个人目标与项目组织目标深度融合的项目绩效考核激励机制显得尤为重要。此举不仅能够激发个体的最大潜能，还能确保项目团队的整体沟通效能得到最大化发挥。

首先，J 公司应建立有效的项目绩效评价体系。包含设定关键绩效评价指标、设立评估标准和方法、明确考核周期和流程、持续优化与改进几个方面。

J 公司开发项目的绩效评价指标建议从项目成果指标、过程控制指标、团队与个人

中国知网 https://www.cnki.net

能力指标这几个维度来设立。项目成果指标可以设立如项目完成率、质量合格率、客户满意度等指标。过程控制指标可以设立如项目进度控制、成本控制、风险管理等指标。团队与个人能力指标可以设立如团队协作能力、创新能力、问题解决能力等指标。绩效指标设定好之后还要与组员进行充分的沟通，若组员不认同或者双方之间无法达成一致，则该绩效考评机制也无法进行下去。指标的设置遵循 SMART 原则，即绩效指标必须是具体的、可衡量的、可达成的、与本职位内容具有相关性、有明确的截止期限。例如从项目沟通管理的角度出发，结合前述汇流排项目沟通管理的问题点，在项目考评指标中就可以细化出员工参与例会的情况、项目进度的落实情况、任务完成的及时度情况、信息反馈的及时性等等指标，针对绩效考评结果还需附上相应的数据作为佐证。此外，还需要加强企业内部的考核流程管控，落实考核人的职责、考核的具体方法以及项目组员对绩效有异议的申诉流程，以此来确保考核的公平性和合理性。在绩效考核体系的初步实施阶段，需要持续优化与精进考评指标是确保其合理性与精确性。基于 J 公司当前的考核框架，项目成员的月度绩效评估依旧交由职能经理主导，而项目经理则通过正式邮件渠道向各职能部门经理提供项目绩效的相关数据。至于两者在考核中所占比重的分配，应通过双方充分协商确定，以既保障项目经理获得适度行政授权，便于其运用有效的激励措施，又实现项目经理与职能经理间考核权重的平衡，从而为项目管理活动的顺畅进行及成员绩效考核的全面性与科学性奠定坚实基础。

其次，在大多数企业的激励机制中，都具备物质和精神两个层面。但是在项目化组织中，还同时存在职能工作和项目工作两个方面的激励维度。职能工作的激励部分与传统组织比较类似，而与项目相关的激励是项目化组织激励制度中的最大特色，主要表现为引入了项目薪酬指数和项目贡献指数，分别对员工的薪酬和奖励产生重大影响。项目的薪酬指数把员工从事项目的成果、项目的管理质量、项目的进度、预算、质量情况与员工的收入进行了一定权重的挂钩。因此，为切实增强激励机制对员工工作热情的驱动作用，有必要将项目绩效评价与员工薪资福利体系更紧密地结合。鉴于 J 公司当前仅将月度绩效考评结果应用于年终奖金分配，且与日常薪资脱节，加之考核周期较长，难以即时激发员工积极性，建议将项目绩效考评成果直接纳入月度薪酬福利计算中。通过这一变革，可以利用共同利益纽带加深个人与团队间的联结，激发项目组成员的工作动力与协作意愿。具体实施时，可将员工月薪分解为固定薪资与浮动绩效薪资两部分，具体权重设置则由公司人力资源部与高层管理层深入研讨后对外公布并执行。在权重设置方面要注意绩效薪资部分既不能过高也不能过低，如果权重过高会增强考核人员的权力，导致项目成员每月的收益得不到保障，反而可能引起团队成员的负面情绪起到反面效果，如果权重过低，就无法体现出个体之间的绩效差异，起不到激励的作用。在前期试运行

中国知网 https://www.cnki.net

阶段，可以参照同行业大部分企业的做法。目前按照固定薪资占比 80%，绩效薪资占比 20%试运行，后期根据运行的具体情况以及对绩效数据的整理和分析，及时调整和优化薪资权重。最后，由职能经理制定绩效分数与绩效发放比例对应表，目前数据借鉴同行业其他公司绩效管理的经验值，下表 4.1 的比例作为初期试运行标准，后期根据执行效果再逐步优化，形成完善的绩效管理体系。

表 4.1 绩效分数-绩效发放比例对应表

Tab. 4.1 Corresponding table of performance score and performance distribution ratio

绩效评价	绩效得分范围	绩效发放比例
优秀+	100 分以上	110%
优秀	90~100 分	100%
良好	80~89 分	90%
一般	70~79 分	80%
及格	60~69 分	60%
差	60 分以下	0%

注：数据来源于 J 公司内部资料

项目组员的月薪资=固定薪资+绩效比例*绩效薪资。从对应表 4.1 中可以看出，绩效分数直接影响了项目组员当月的收入。把组员的绩效和每月薪资相关联，由原来固定薪资收入变更为浮动薪资收入，薪资的收入取决于个人当月综合工作表现，其中绩效总得分包含了项目经理提供的项目评价分数，通过这种绩效考核方法能够对组员的行为产生一定的约束力，增强组员的积极性，主动去解决项目过程中发生的问题，主动反馈，增强团队成员之间的相互沟通意识，从而实现对项目成员的激励。

通过以上这些绩效考核步骤的实施，可以建立起一套科学、公正、透明的项目绩效考核机制，为企业的发展和员工的成长提供有力支持。

4.1.3 建立项目沟通奖惩机制

所谓奖惩机制，即通过适当的激励和约束手段，促进项目成员之间的有效沟通，提升沟通计划的执行效率和质量。J 公司的奖惩机制建议参照如下流程来制定和执行。

首先，应当制定奖惩的标准。对于奖励标准，结合 J 公司项目沟通管理的现状，建议设立沟通效率奖、团队协作奖、创新贡献奖。对于在项目沟通过程中能够迅速响应、准确传达信息、有效解决问题的成员或团队，可以设立沟通效率奖。奖励形式可以包括奖金、表彰证书或额外休假等。对于在团队沟通中积极协作、促进团队氛围和谐、提升团队整体表现的成员或团队，可以给予团队协作奖。这有助于增强团队成员之间的信任

中国知网 https://www.cnki.net

和合作意愿。对于在沟通管理中提出创新性建议或改进措施，并成功实施后显著提升沟通效率的成员，可以设立创新贡献奖。这有助于激发团队成员的创新精神和积极性。针对惩罚标准，结合 J 公司项目沟通管理的现状，建议设立沟通延误惩罚、沟通失误惩罚、违反沟通规定惩罚。对于未能按时完成沟通任务、导致项目进展受阻的成员，可以根据延误的严重程度给予相应的惩罚，如警告、扣除奖金或绩效奖金等。对于在沟通过程中因疏忽大意导致信息传递错误或遗漏，进而对项目造成不利影响的成员，应给予相应的惩罚，以提高其责任心和谨慎程度。对于违反项目沟通管理规定的行为，如擅自更改沟通渠道、拒绝参与沟通会议等，应制定明确的惩罚措施，如罚款、通报批评或限制参与项目等。

其次，还应确保奖惩机制的公平性和透明度。可以设立评审小组、公开奖惩结果、提供申诉渠道的方式来确保奖惩机制的公平性和透明度。由项目经理、团队成员代表及第三方专家组成评审小组，负责对奖惩申请进行评审，确保评审结果的公正性和客观性。将奖惩结果及时公开，让团队成员了解奖惩的依据和结果，增强奖惩机制的透明度和公信力。对于奖惩结果有异议的成员，应提供申诉渠道和流程，确保每个成员的权益得到保障。

此外，对奖惩机制进行实施和监督，包括制定详细的实施计划，针对实施情况进行定期检查和监督。明确奖惩机制的实施步骤、时间节点和责任人，确保奖惩机制能够顺利落地执行。定期对奖惩机制的实施情况进行监督和检查，确保奖惩措施得到有效执行，并对发现的问题及时进行整改和优化。

不合适的奖惩机制只会适得其反，因此最终还需要对奖惩机制进行持续优化与改进，包括收集反馈意见、持续优化奖惩标准、引入先进管理工具。定期向团队成员收集关于奖惩机制的反馈意见，了解其对奖惩机制的满意度和改进建议。根据反馈意见和项目实际情况，持续优化奖惩标准，确保其符合项目管理的需求和团队成员的期望。借助专业的项目管理工具（如 PingCode、Worktile 等），实现奖惩机制的自动化管理和数据分析，提高管理效率和准确性。

通过以上步骤和要点，建立起一套科学、合理、有效的项目沟通管理奖惩机制，为项目的顺利执行和团队的高效协作提供有力保障。

4.2 丰富员工的专业实践经验

沟通的目的就是要有效地传达和接收信息。掌握沟通的目的，同时掌握沟通的要领，注重沟通的技巧，才能提高沟通效率，达成沟通目的。影响沟通效果的主要因素分为二个方面，分别为个体因素和组织因素。其中个体因素主要表现为个体的沟通技能、知识

中国知网 https://www.cnki.net

和经验能力及沟通态度。在 J 公司的项目沟通管理中，正是因为项目成员的专业知识、实践经验以及沟通技能的缺乏导致了沟通信息不准确现象。故针对 J 公司项目成员间沟通信息不准确的问题，建议从增强组员的沟通技能和丰富其项目实践经验两个维度着重改善沟通效果，由企业组织适当的沟通技能的培训以及导师带徒活动。

4.2.1 优化导师带徒活动

导师带徒作为 J 公司增强企业发展后劲、培养人才的一项重要活动，旨在帮助刚走出校门的学生迅速适应职业生活，完成从学生到职员角色的转变，成为一名合格的职工。首先由项目的高层管理者与新进员工进行深入的职业发展对话，此环节旨在全面了解学生的专业优势、自我认知、个性特征以及对未来职业生涯的憧憬。随后，结合公司当前项目发展的实际需求与长远规划，双方共同探讨并明确员工的个性化发展路径。其次，根据选定的发展方向，选择适合的导师，安排师徒交流，达成师徒意向并签订导师带徒协议，协议中明确双方的职责。导师需要为学院制定培训目标及具体的培训计划，并对学院实行月度考核。最后，半年后组织针对导师带徒活动进行考核评价。通过导师的指导和教育，徒弟本可以学到很多经验和问题处理的技巧，更好的掌握本领域的专业知识和技能，但实际情况并没有达到培养的目标，主要还是由于目前的导师带徒制存在诸多缺陷，主要表现为三个方面。一是部分项目对“师带徒”人才培养模式认识不够，公司有指标、有规定，因此项目也就有了对策，在实际操作过程中签订了“师带徒”协议就算完事，每到上级检查或者考核时就适当做做工作应付了事。二是目前组织内部人员流动性比较大，随着师傅或者徒弟的调离，导师“师带徒”成为一纸空文；三是部分的”师带徒“的人员安排不是很合理，有的导师本身就已经兼任数个项目及职能部门的工作，还要在此基础上再辅导学员，可谓是心有余而力不足。四是”师带徒“的考核指标不够量化，过程中也缺少监督、跟踪和过程控制。“师带徒”作为一种低成本人才培养模式，只要对其实行行之有效的管理措施，依然能够实现高回报的人才培养的作用。建议目前 J 公司的“师带徒”活动从如下几个方面去优化，以达到快速增强员工专业知识和经验技能的目的。

首先，建立健全现有的“师带徒”人才培养制度，组织应该根据实际项目的需求，细化“师带徒”的活动实施细则，对传授内容、师徒职责及考核标准进行具体规范，由公司各个部门的高层领导组成领导班子定期对“师带徒”进行监督和考核，从新员工的理论知识和实际项目操作等方面进行月度考核。

其次，选择合适的人作为导师，切勿一味地追求高资历、高职务的人作为导师，虽然这样的人作为传道授业解惑来讲应该是最合适的人选，但同时应该也要清楚这类人需要花费更多的时间和精力从宏观上去处理项目上存在的诸多问题，因此也就决定了这类

中国知网 https://www.cnki.net

人不可能实时待在生产线，而很多新员工一般都要深入现场从基础的技术开始了解和学习，这样就造成教与学之间的矛盾。因此在选择导师时需要从多角度综合考虑，既要考虑其人选的资历，也要考虑是否能够深入现场对新员工实行适当的指导。

再次，为了保证师徒关系的稳定性，公司、项目在调动的过程中，可以采取师徒共同调动的办法，稳定师徒关系，保证师徒教学的延续性。

最后，还需要实行行之有效的激励方式作为补充，马斯洛的需要层次理论将人的需求分为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求五个层次。对于导师来说，通过“师带徒”这种人才培养模式可以将自己丰富的经验和知识传授给新员工，能够继续为企业的发展发光发热是他们追求自我价值实现的有效途径。对于新员工来说，通过尽快吸收丰富的知识、经验达到快速融入工作环境，提升自身薪酬待遇和岗位，从而实现自我价值的提升将是新员工的追求。因此，企业内部可以制定合理的激励竞争机制，通过提高导师的补助津贴，让导师更愿意花更多的时间和精力教授新员工。

4.2.2 定期举办沟通技能的培训

沟通能力的提升是一门学问，但只要是学问就可以通过学习来进行提升。沟通能力的提升可以靠团队成员自发的学习，也可以靠团队组织，但人都有惰性，也都有自己的倾向，因此在实际执行过程中，还需要辅以组织的沟通技能培训有针对性地提升成员的沟通技能。

所谓沟通技能，指项目团队成员能够收集和发送信息，能够通过书写、口头与肢体语言的媒介，有效及明确地向他人表达自己的想法、感受与态度，亦能较快且正确地解读他人信息，从而了解他人想法、感受与态度的能力。对于项目成员而言，掌握良好的沟通技巧有助于其树立良好的人际关系，在短时间内传达清晰、准确的信息，避免因误解而导致的重复工作和时间的浪费，从而提升项目工作的效率以及更好地进行团队协作。

根据阿吉里斯“不成熟-成熟”理论，J 公司开发项目组应当精心构建一套针对性的培训体系，旨在促进员工沟通技能由青涩向成熟蜕变，进而强化项目内部沟通的有效性，确保信息流通的顺畅与高效。各项目成员的沟通技能对项目的沟通管理将产生直接的影响，需要根据 J 公司所面临的实际的沟通管理问题以及各部门的培训诉求制定对应的培训计划。具体的培训需要从以下几个方面进行开展：

首先，应该根据每个项目的实际情况和员工对于培训的实际需求，制定出详细的培训计划，包括培训内容、时间、地点和参与人员。其次，需要确定培训的主题，例如针对项目内部信息沟通中存在的问题和需要提高的方面，确定培训的主题和重点，结合 J 公司开发项目的具体情况，建议针对沟通技巧和有效会议两个主题进行培训。培训形式可以分为内部共享和聘请外部专业培训两种方式，内部分享侧重于实际案例的经验分享

中国知网 https://www.cnki.net

和交流，外部培训侧重于沟通技巧的专业提升。在培训中还需要组织模拟演练，让组员在实际操作中掌握沟通的技巧，提高沟通水平和沟通效率。J 公司可融合内部资源与团建活动，策划沟通技能的模拟演练。活动前，至少提前一周发布通知，以确保全员知晓并做好参与准备。培训期间，实施严格的签到制度，以保障高出勤率，从而提升培训的整体效果。培训结束后，组织应定期实施非预设的沟通满意度抽查，精选代表性案例进行分享，甚至设置内部模拟场景，鼓励员工互换角色进行实战演练。通过这种换位思考的方式，不仅能够增进彼此理解，还能显著提升团队沟通的实际成效。

4.3 明确项目沟通方式的标准规范

4.3.1 完善项目沟通方式

积极探索并实践多元化的沟通策略，不仅能够有效缓解传统单一沟通模式所带来的压力与局限，还能巧妙融合不同沟通渠道的特性与优势，从而显著提升信息传递的效率与质量，促进更加顺畅与高效的沟通环境构建。结合目前 J 公司沟通管理工作具体存在的问题，创新沟通方式可以从非正式沟通方面进行。

考虑到 J 公司沟通管理中出现的具体问题，建议引入企业微信，作为沟通的工具替代个人微信。合理调控企业微信管理策略，避免“信息过载”现象，确保沟通效率与质量。通过科学规划沟通时段与内容，借助新媒体平台的智能管控功能，规避对相关人员的不必要干扰，优化沟通环境。同时，为摆脱个人微信等非正式渠道可能带来的沟通冗余与低效，企业微信被构建为一个结构化的沟通平台，层次分明的架构促进了信息的有效筛选与传递，能够显著提升信息交流的针对性和实效性。企业微信相较于个人微信具有如下功能，可以利用这些功能有效解决目前 J 公司项目组织所遇到的痛点。

功能一，消息群发至企业成员，企业微信管理员工可以将消息群发送至企业成员，内容可以选择公告、自建应用、第三方应用等，发送之后可以查看发送记录和素材库。

功能二，信息的“已读”和“未读”功能。企业微信具有信息“已读”和“未读”功能，这样发送者能清晰的了解信息接收者是否有看到信息，以便做出进一步的反馈追踪。

功能三，数据同步。配置 Exchange 邮箱、日历数据同步，配置组织架构同步，成员可以清晰的看到其每天的会议日程安排，组织架构中任何人员的联系方式，方便成员之间的沟通联系。

中国知网 https://www.cnki.net

功能四安全管理。企业可以根据自身需求，设置不同权限，包含账号、信息防泄漏等内容的安全管理功能，企业还可以统一管理聊天、邮件及别的应用中的文件操作权限，追溯各种行为，比如浏览、下载、编辑、转发等信息泄露风险。

除了引入新媒体沟通工具之外，还可以充分利用各种讨论会议和非正式活动，来丰富项目的沟通方式。不同形式的讨论会和辩论能够集思广益，管理者亦可以更有效地收集员工的反馈和需求。在项目沟通过程中，管理者应扮演积极互动的角色，针对具体问题，鼓励采用头脑风暴、圆桌论坛等多元化方法，共同探索创新解决方案。此外，应着力构建水平沟通渠道，促进信息无障碍流通。项目执行期间，一旦发现跨部门协作与信息流通效率受阻，部门负责人应立即响应，策划并执行包括聚餐、团队建设等在内的非正式交流活动，打破部门壁垒，增进相互理解，从而有效消除沟通障碍，促进项目整体进展。

4.3.2 明确微信的使用规范

项目的沟通管理规划不但要明确沟通的方式和渠道，还要明确运用沟通方式和渠道所对应的管理要求。不同的沟通工具对应不同的管理要求。针对微信群事项，可做出如下管理要求。

优化群聊管理。设立明确的群聊沟通规则，规定哪些信息可以发布，在何时发布。限定发言范围和角色，明确哪些角色负责发布关键信息，并通过设置管理员进行信息筛选和引导，减少不必要的聊天内容；实行分组沟通，将微信群聊按照项目、任务或话题进行划分，不同的工作话题放在相应的群组中，避免所有内容混杂在一个群中。

实行信息分类。微信群内可以使用微信群自带的“置顶消息”或“标签”等功能，确保重要信息不会被其他内容淹没，成员可以方便地查看关键信息。

定期总结与反馈。每日或者每周汇总群内信息，每个项目团队可以安排专人负责定期总结群内的关键进展和任务安排，发布在群公告或者其他统一平台，便于各项目成员及时查看，减少反复浏览聊天记录的负担；设立反馈机制，团队成员可以定期提供关于信息过载的反馈，项目经理或者群管理员应根据反馈及时调整微信群沟通方式和规则。

微信群聊的沟通要杜绝官僚主义，领导发布消息之后无需点赞和回复收到等敷衍性消息，让群内信息尽量精简、有效。

4.4 营造友好的组织沟通氛围

4.4.1 营造积极向上的沟通氛围

一个团队缺乏有效的沟通和交流，会导致诸如工作重叠、职责不明确、决策难以达成，甚至引发矛盾和冲突。因此，在团队中建立积极的沟通和交流文化，是构建团队合

中国知网 https://www.cnki.net

作和提高团队绩效的关键因素。良好的沟通文化是组织高效沟通机制的灵魂。首先，组织管理者需要树立开放、包容、尊重的沟通文化，鼓励员工分享想法和意见，不害怕提出批评，同时要尊重不同的观点和意见。其次，建立定期的沟通渠道，例如，定期的团队会议，一对一的沟通、员工调研、匿名反馈等形式，让项目成员有机会表达他们的想法和问题。此外，作为管理者需要倾听成员的需求和反馈，给予及时的回应，并且表现出真诚的关心和关注。最后，建立开放透明的信息共享机制，让员工了解组织的发展方向，决策过程和重要信息，增强员工的主人翁意识以及对组织的归属感和信任感。

J 公司汇流排项目的沟通氛围较弱，平行部门之间沟通较少，项目成员各自为战，且大部分沟通以正式沟通为主，成员在这样的沟通方式和环境下显得较为拘谨，不愿意、不善于表达自己真实的想法和建议，针对项目执行过程中所遇到的问题也不能够及时的反馈，被动等待项目经理询问。结合上述组织文化理论和沟通氛围对组织的影响，建议 J 公司可以通过如下的实际操作，增强组织的沟通氛围。

定期举办团队建设活动。有效的团建活动可以提升团队的凝聚力，通过团建活动，员工之间可以更好地了解彼此，增强彼此的信任和合作意愿；有效的团建活动还可以增强团队成员之间的沟通能力，团建活动通常需要员工之间相互交流、协作，在这个过程中，团队成员的沟通能力不知不觉被增强。有效的团建活动还可以增强成员对组织的归属感，通过团建活动，员工可以更好地融入团队，感受到组织的温暖和关怀，从而增强对组织的归属感。

建立透明的信息传递渠道，确保员工能够及时获取到组织的重要信息和决策。具体可以通过内部通讯工具、邮件或者公司公众号等方式来传递信息。或者可以举行季度的全员大会，向员工公布公司的经营状况、发展计划、项目情况等重要信息，并接受员工的提问和意见。这类举措可以有效促进组织内部信息的流动和共享，增强员工凝聚力和归属感，以及对组织目标和使命的认同感。

建立匿名反馈的渠道，比如定期的匿名调查问卷或者设立匿名信箱或者可以匿名发布信息的内部平台，员工可以在上面发布信息、分享经验、提出反馈或建议等等。这种匿名的调查反馈方式能够保证参与者最大程度上表达他们真实的想法和意见，而不必担心收到批评或者面临其他任何后果，有助于在参与者和调查者之间建立信任，从而获得更准、更可靠的数据，以此帮助管理者改善管理，提升沟通管理的效率。

定期开展沟通技巧的培训和讨论，让员工学习和分享沟通经验，建立团队成员之间的信任感和敬意，同时帮助他们掌握更好的沟通技能。在沟通中要多赞美对方，满足员工的心理需要，若在实际工作中有些成员的做法不合适，可以通过适当的沟通使他（她）意识到错误，其改进效果肯定优于直接批评和指责。

中国知网 https://www.cnki.net

4.4.2 建立合理的沟通反馈机制

沟通本质上是一个以信息为媒介，向接收者传递意图并寻求相应回应的过程。反馈作为此过程的关键环节，使得信息发送者能够即时洞察信息传递过程中是否存在误解或失真，进而迅速调整策略与反馈，确保沟通的准确性。在当前信息爆炸的时代背景下，个体每日需应对海量信息，其中部分需即时处理，而另一些则仅需知晓。对于那些亟待快速处理的信息，及时的反馈尤为关键，它有助于避免沟通瓶颈的产生，确保项目进展不受阻滞，维持高效的运作节奏。J 公司开发项目管理中存在临近交付节点，却延迟交付的现象，分析后大部分原因是由于信息反馈不及时或者信息不明确的原因所导致，没有形成信息闭环。这种现象的长期存在会导致员工工作的积极性降低，不利于项目成员整体能力的提升。因此，在项目沟通管理前期建立有效的信息沟通反馈机制显得尤为必要。

首先在信息发送环节，信息发送者必须要明确传达信息的目的、信息的具体内容以及期望得到的反馈。确保发送的信息准确、简洁、易懂，避免模糊不清或者容易产生歧义的表述。比如在项目任务分配时，明确说明任务的目标、具体要求和完成时间。此外还要根据信息的重要性和紧急程度，选择合适的沟通工具。如果是重要的决策或者是复杂的问题，可能面对面更合适；而日常的交流可以使用即时通讯工具。在日常项目管理中的沟通环节，可以采用如企业微信、钉钉等高效的办公软件作为沟通平台。这些平台内置的“已读/未读”状态标记功能，不仅赋予了信息发送者实时监控信息传递进度的能力，还极大地方便了后续信息流转的追溯与核查。借助此功能，发送者能够精准识别信息已被接收者查阅的状态，进而适时地促请接收者提供反馈。特别是在即时通讯软件明确显示接收者已阅读消息后，这一机制更加促进了沟通效率与响应速度的提升，若在即时沟通软件中显示接收者已读但未回复，可以追加信息并设定回复期限，或者电话沟通。若超过规定时间显示信息未读，则可电话提醒接收者查看信息并要求回复。这种做法不仅能增强项目成员的沟通意识，也能提高其工作责任心，确保信息传递和反馈的及时性。J 公司目前所采用的办公软件为微软的 Outlook 邮箱和个人微信。这两者都不具备上述的信息“已读/未读功能”，因此成员也无法及时的知晓其发布的信息是否有被接收者接收和阅读，若挨个询问不仅浪费精力、效率低下还造成团队成员的反感。

其次，是信息接收者对于信息反馈环节。信息接收者要及时反馈，避免拖延。如果无法在规定时间内完成任务，也要及时告知对方原因以及预计可以完成的时间。反馈的内容要具体、客观，避免模糊或者笼统的描述。可结合实际情况，提工具体的数据或者建议。对于项目中一些比较重要的信息沟通，可以建立项目信息化管理系统，在其中开发任务指派模块，专门用于项目信息沟通管理。该模块包含风险事项登记和任务推送功

中国知网 https://www.cnki.net

能，项目经理可以在系统中推送任务给成员，明确任务的具体内容和要求的完成时间，要求接收者每日在系统中汇报任务的当前进展、超时系统会提醒。例如项目经理可以通过此方式在系统推送设备维修任务给相关人员，明确任务的具体内容和要求的完成时间，要求计划员和设备维修人员每日在系统中汇报任务的当前进度，这样项目经理可以在第一时间获取到任务的最新进展。这种方式可以规避邮件或者即时通讯软件导致的沟通遗漏或障碍，项目成员只需要在系统录入相关数据，管理者能够更好的监控项目状态和管理干系人，提高沟通效率、推动项目进展。

此外，还要定期的对整个沟通反馈的过程进行评估，不断地改进机制。通过评估结果来分析判断沟通反馈是否能达到预期的目的，信息是否被准确的传递和理解，问题是否得到有效的解决。评估方法可以通过问卷调查或者个人访谈的方式来进行。评估结束后，根据评估结果，制定相应的改进措施。例如，发现沟通方式不高效，可以尝试引入新的沟通工具或者调整沟通流程；如果反馈不够及时，可以加强对反馈时间的监督和管理。

4.4.3 完善项目沟通的渠道

针对 J 公司在开发项目沟通管理中出现的成员主动沟通意识薄弱以及沟通缺乏反馈的问题，建议完善项目的沟通渠道。根据 J 公司项目组的沟通计划可以看出，J 公司的沟通形式以正式沟通为主，正式沟通中又以邮件和会议或者微信群聊为主，在这种正式沟通环境下，信息自上而下传递，项目成员被动的接收信息，很少主动反馈，久而久之，成员与领导之间的沟通距离越来越大，高层的人不愿意被较低级别的员工打扰，低层的员工也缺乏与高层领导沟通的信心。团队成员之间不是特别熟悉，沟通过程中彼此缺乏理解，因此解决问题也变得非常困难。目前，J 公司除了面对面的口头非正式沟通，基本没有其他非正式沟通渠道。鉴于此，建议扩展 J 公司开发项目的非正式沟通渠道，充分利用非正式沟通的优点，提高团队成员沟通的积极性和弥补沟通方式的不足。

建议通过如下方式拓展 J 公司开发项目的非正式沟通渠道。首先，积极组织团队建设活动，例如团队聚餐、团队游戏、户外拓展活动等，在这种环境下，每个员工都可以在各个级别进行交谈和自由组合，因此很容易在各个级别和职位的成员之间建立一种相互理解的环境和文化，促进成员之间的交流与了解，提升团队的凝聚力，其次，还可以定期举行非正式团队会议或者茶话会，让团队成员互相分享工作心得、生活趣事，增进彼此之间的了解。此外，还可以建立成员与领导之间的一对一交流，可以是面对面的聊天或者电话，让领导更亲近成员，了解成员内心更真实的想法，让成员打破信任障碍，更愿意主动沟通，反馈问题，帮助彼此建立更深层次的沟通和信任，在这种环境下，成员的恐惧因素可以忽略不计，还有可能会产生有价值的意见和建议。还可以启用企业微

中国知网 https://www.cnki.net

信 app，利用其中的共享日程安排功能，让团队成员了解彼此的工作日程安排和可用时间，既能方便安排非正式的交流，又能避免沟通上的时间冲突。这种非正式的沟通模式让每个成员都有权力与公司的任何人接触，无论其职位或级别如何，有利于营造快乐的团队氛围，激发团队成员的主动沟通意识，由于员工可以在无忧无虑的氛围中表达不同意见，项目经理和团队成员之间的误解也会变得更少，沟通将更顺畅。

中国知网 https://www.cnki.net

5 J 公司开发项目沟通管理改进保障措施

5.1 组织文化保障

J 公司作为一个以开发为核心的企业，必须意识到沟通对创新的重要作用，必须建立开放的沟通文化。通过打造开放和平等的企业文化，促进员工积极主动沟通，激发他们的创新活力。在项目开发与沟通管理的持续优化进程中，积极向上的企业文化作为沟通顺畅的坚实基石，能够提升沟通效率。从宏观视角审视，沟通管理镶嵌于企业文化氛围中，是员工间思想碰撞与意识交流的动态过程。微观层面而言，它亦是个体内心与外界对话、自我认知与表达的桥梁。无论宏观还是微观，沟通管理均深刻映射并丰富着企业文化的内涵。鉴于当前沟通管理实践的具体需求，J 公司构建企业文化需聚焦于以下几个关键维度：

首要任务是培育学习导向的企业文化。尽管企业培训对于提升员工的沟通素养与能力具有积极作用，但其局限性不容忽视，难以全面覆盖员工能力成长的多元化需求。鉴于此，J 公司应着力从多维度构建学习型文化氛围，具体措施涵盖但不限于以下方面，旨在通过持续学习与自我提升，为沟通管理工作注入不竭动力：

首先，可以建立线下图书馆，提供项目管理以及与 J 公司所开发的产品相关的专业的理论学习资源。可以通过设置阅读打卡等活动，鼓励员工积极阅读专业数据，营造浓厚的学习型企业氛围。公司的管理者也应以身作则，积极参与各种学习活动，助力良好学习环境的形成。

其次，基于沟通管理的丰富内涵，鼓励员工跨领域学习，全面掌握沟通管理的精髓，并积极参与多样化的培训活动，以促进知识的多角度吸收与应用。学习型企业文化的构建应紧密围绕项目沟通管理的实际需求，灵活调整与优化，以营造更为浓厚的学习氛围，为项目沟通管理的有效实施提供坚实支撑。

此外，构建协作型企业文化同样至关重要。作为项目部门间无缝衔接的基石，员工间的沟通是确保项目顺利推进的关键。在协作型文化的熏陶下，员工将更加主动地面对项目挑战，乐于通过高效的沟通分享项目进展与情感交流，从而营造积极向上的工作氛围，显著增强沟通管理的效能。为实现这一目标，J 公司应精心策划各类文娱及团队建设活动，如户外拓展、主题辩论、创意头脑风暴及沙盘推演等，为不同部门员工创造深入交流的平台，增进彼此对项目细节、沟通要点、岗位职责及目标愿景的理解。面对问题，公司应引导员工基于问题导向，设计跨部门协作流程，积极联动上下游部门，共同寻求解决方案，充分发挥协作型企业文化在促进项目沟通管理中的独特作用。

中国知网 https://www.cnki.net

另外，还可以塑造创新型企业文化。在优化员工沟通策略中，多次提到使用创新沟通方式和使用新工具方法来提升沟通效率，还能让员工在实际工作中遇到沟通问题时积极寻找解决方案，从而提升沟通效果。J 公司应设立沟通管理创新奖励基金，进一步激发员工的创新欲望。对于积极提出问题解决方案和创新沟通方式的员工，J 公司应给予充分的肯定和鼓励。当项目达到预设的里程碑时，J 公司应实施科学严谨的考核评价体系，对各部门员工的沟通管理成效进行全面评估，并依据考核结果实施奖励机制，以此激发全体成员投身于沟通管理创新实践的积极性。在项目沟通管理中，公司还应积极构建渠道与模式创新的激励机制，鼓励员工探索并利用多元化的沟通渠道，丰富沟通内涵。通过设立年度“项目沟通管理创新卓越奖”，旨在表彰并推广在沟通技术、渠道及内容创新方面表现突出的个人或团队，进而在整个组织范围内形成崇尚创新、勇于尝试的良好氛围，使员工在项目执行过程中更加注重新型沟通方式的应用与探索。

最后，塑造实践导向的企业文化尤为关键，这要求企业不仅仅停留于理论探讨或口号宣传，而是要将文化理念转化为实际行动。在此过程中，领导者需扮演多重角色，既是方向的探索者与引领者，也需身体力行成为实践的楷模。公司高层应主动深入基层，与员工建立紧密的联系，以开放和平等的姿态进行沟通，倾听来自一线的声音，及时解答疑惑，排忧解难。同时，坚持信息透明化原则，增强员工对公司决策的认同感与信任度。这些有意义的日常互动能够营造友好的氛围，促进企业内部的良好沟通和交流。领导做到开诚布公、明确坦然，切勿让员工去揣摩领导的意图。当然，也要重视情感的培养，让员工对企业有自豪感和归属感，树立其主人翁意识。工作不仅仅是完成任务，更是实现个人与企业的共同进步和发展。

5.2 项目激励资金保障

企业的运作和发展，必须有充足的资金作为支撑。充足的资金支持能够显著提升项目的沟通管理，可以为项目的开发和实施提供经济保障。首先，充裕的资金可以用来构建和维护优质的沟通基础设施，例如在线视频会议系统、在线协作工具和通信平台等。此类基础设施的完善，能够极大促进团队成员间的即时互动与信息共享，进而提升了沟通效率与质量。其次，充足的资金资源能够为团队沟通能力的提升提供物质基础，它不仅支持专业技能培训，还涵盖了项目所需的一切沟通辅助资源，旨在全方位增强团队成员的沟通技巧与表达能力，确保沟通质量达到新高度。此外，充足的资金还可以用于设置奖励和激励机制，表彰沟通表现优异的成员，能够有效激发团队成员的沟通积极性，促使他们在项目全周期内维持高水准的沟通状态。最后，充足的资金还可以用于支持更好的团队建设活动，例如团队聚会、社交互动等，这些活动不仅能够加深成员间的相互

中国知网 https://www.cnki.net

理解和信任，进而促使团队成员间更加顺畅的沟通与合作。

对于J公司开发项目来说，需要专门设立一笔沟通管理专项资金来提强有力的支持。这笔专项资金将会投入到诸如丰富多彩的团建活动、系统全面的人员培训以及科学合理的考核激励等相关活动的组织与实施当中。当开发项目进入正式开发阶段，一定要预留出一定规模且数量充足的沟通管理专项资金，从而确保沟通管理相关工作能够有条不紊的顺利开展，构筑起坚实可靠的资金保障壁垒。对于专项资金的使用，务必提前上报详细完备的方案，只有在经过项目经理严谨细致的审批通过之后，才能够予以支取，绝对不允许出现超越既定程序办理的情况。并且，要在第一时间及时建立清晰明确的台账，以便于后续的核查工作。此外，还需要对沟通管理专项资金进行周期性、常态化的核查。通过这样的核查工作，全力保障资金的安全性，精准核实资金的使用范围，坚决确保资金能够专款专用，并且切实用到关键之处，充分挖掘并发挥出专项资金的最大效益。

在竞争激烈的商业环境中，资金的地位举足轻重，堪称根本所在。于当下快速发展的现代社会而言，企业若想在波谲云诡的市场中站稳脚跟并不断拓展，就需要巧妙地借助恰当的资本力量来推动自身的发展。尤其是在这个处处需要投入大量资金的行业里，各方参与者都会不遗余力，全力以赴地去争夺优秀的人才、先进的技术以及宝贵的时间。而通过巧妙地借助资本市场的力量，能够为J公司构建起充足的资金保障。从而助力其稳健前行。

5.3 项目管理信息系统保障

传统的团队沟通方式多采用口头及书面方式进行沟通，这种沟通方式不便于沟通记录的留存和及时共享，在后续的项目工作中无法快速调取需要的沟通记录。伴随着办公工具的发展，当下项目团队会利用社交媒体工具进行协作，这种沟通方式要避免多个平台工具交叉混杂使用的情况，以免无法及时获取重要的沟通信息，且聊天文件记录无法长期保存。统一的项目沟通管理平台作为一种高校的项目信息交流工具，其重要性不言而喻。目前J公司的主要沟通方式仍然依赖于口头、微信和邮件等这样的传统沟通方式，虽然在后期引入了项目管理信息系统，但是因缺乏对项目沟通管理信息系统的使用引导，导致项目管理信息系统没有实现其真正的价值。因此，需要加强对项目管理信息系统的使用引导，可从如下几个方面进行。

首先，需要明确项目管理信息系统的作用和价值，确保项目成员认可该沟通管理工具，只有认可该沟通管理工具，才能利用该工具实现项目信息的分享和沟通，确保项目成员间的信息交流畅通无阻。该工具有助于团队成员共享项目进度、成员间的任务分配等信息，还能进一步推动团队成员间的交流和协作。且项目信息沟通平台的统一可以免

中国知网 https://www.cnki.net

去成员查看多个平台信息的繁琐、并且可以快速搜索获取自己需要的聊天信息及文件。项目信息管理系统不仅可以帮助团队避免重复工作、减少沟通冲突和误解，还能提高沟通效率以及决策质量。

其次，还需要制定相应的行为规范和操作规则，包括如何发布信息、如何查看信息、如何管理信息等。通过规范工具的使用，才能保证平台的正常运行和提升项目沟通的质量，减少信息混乱，提高信息传递的效率和质量。除此之外，还需要提高成员的使用技能。包括如何正确使用各种功能、如何快速查询需要的信息、如何有效地使用信息管理系统进行团队协作等等。可以通过设置平台使用指南、制定平台规则等方式对平台的使用者进行培训指导，针对新加入公司的项目成员，可以设置“新手指南”、“使用教学”等模块进行引导。

最后，还要对信息管理系统的持续改进和提升，通过建立有效的反馈机制，包括使用成员提出平台使用过程中所遇到的问题或者系统设置不合理的地方以及其他建议，定期对平台的使用情况进行跟踪调查。通过反馈机制，平台可以及时检测并解决系统所存在的问题及不适应性，从而提高管理信息系统的有效性。

加强对项目管理信息系统的使用引导对于提高项目成员的沟通效率、沟通质量具有非凡的意义。通过明确管理信息系统的作用和价值、规范使用方式、提升使用技能以及建立反馈机制，能够显著提升项目沟通的效率和质量，为项目的实施和项目目标的实现提供坚实的保障。在实际的运行过程中，还应根据 J 公司不同开发项目的特点和具体情况，灵活运用各种策略，不断改进和优化系统的使用体验，充分利用管理信息系统的价值。

5.4 人力资源保障

在企业的战略规划与管理体系中，人力资源规划占据着前瞻性与战略性的双重核心地位，对于推动企业总体发展战略及其目标的达成具有不可估量的价值。在众多生产力要素中，人以其独有的活跃性与创造力脱颖而出，成为驱动企业前行的关键力量。现代企业管理理念深刻体现了“以人为本”的核心，将人视为知识、信息及技术的核心载体，赋予其在企业发展中的主导地位。人力资源，作为企业最为珍视的无形资产，其重要性不言而喻。企业间的激烈竞争，归根结底，是对高质量人才的争夺与培养。正如美国钢铁巨擘卡耐基所言：“即便我的企业遭遇不测，只要人才犹存，我仍能在二十载后重建钢铁王国。”此言精辟地揭示了人力资源之于企业发展的决定性意义，强调了市场主体在经营过程中，必须将人力资源管理的优化与升级置于战略高度，以人才为基石，筑就企业可持续发展的坚固堡垒。

中国知网 https://www.cnki.net

有效的人力资源管理能够确保项目团队成员的工作能力和工作积极性得到充分发挥。不管是项目团队成员还是其他员工，都属于人力资源的范畴，都需要对其进行内在和外在因素的管理。在项目管理中，人力资源管理发挥着至关重要的的保障作用，主要包括组织规划、团队建设、团队管理等方面。人力资源在多个关键领域展现了其不可或缺的保障作用，涵盖从明确团队成员职责分工、优化组织架构布局，到精细化的人员招募与甄选过程，再到对团队成员的持续培训与个人发展计划。此外，它还涉及领导力的艺术化展现、高效沟通与团队协作机制的构建，以及通过激励机制激发团队潜能。在团队建设层面，人力资源同样关注冲突的有效管理，确保团队和谐共进。同时，人力资源还承担着业绩评估的公正执行，以及劳资关系的和谐维护，确保工作环境符合健康与安全法规的高标准要求，全面促进组织的稳健发展。

J 公司以开发项目为核心，开发难度大，对复合型人才及卓越开发者的需求尤为迫切，关键开发人员和管理人员的流失将对 J 公司产生巨大影响。因此，J 公司需要构建一条清晰、畅通的员工职业成长路径，全面覆盖并满足员工多元化发展需求，以此来应对人才流失的挑战。J 公司开发人员群体尤为重视个人价值的实现与职业尊重的获得，因此，J 公司的人力资源管理策略需深度契合这一特点，实施定制化团队建设与管理方案，并配套完善的保障措施，以确保每位成员都能在公司找到归属感与成就感，共同推动项目与企业迈向成功。J 公司的人力资源体系可从如下几方面进行保障：

首先，在团队构建的初期阶段，人力资源管理团队需深入洞察项目开发的具体需求，明确界定成员角色及其与外部组织的交互关系，同时全面审视并识别组织规划中的各项限制与约束条件，旨在为项目管理团队奠定坚实的组织基础与规划支持。

其次，人力资源部门应扮演起知识赋能的角色，不仅为各部门量身定制专业技能培训，还应基于员工个人兴趣与职业规划，提供涵盖项目管理精髓、高效沟通技巧、最新政策法规等多维度的学习资源。这种培训与持续学习的双重驱动，不仅是员工个人成长与能力提升的内在需求，也是企业构建人才竞争优势、强化人力资源保障的重要体现。

最后，J 公司应进一步优化岗位设置与职业发展路径，构建多层次的晋升通道与岗位保障体系，旨在为公司各部门培育并储备一支结构合理、素质优良的阶梯式人才队伍。通过确保各关键岗位均有充足的后备力量，实现人力资源的灵活调配与高效利用。同时，引入与现代人才理念相契合的激励机制，有效激发员工的工作热情与创造力，促使员工在实现个人价值的同时，也为企业创造最大化价值，实现个人与组织的双赢局面。

中国知网 https://www.cnki.net

6 结论

本文针对 J 公司项目组织结构和沟通现状，结合实地调查结果，总结开发项目中各种沟通管理问题及其影响因素。其主要的沟通问题主要体现在项目沟通计划的执行度差、团队成员沟通信息不准确、项目沟通方式不当、团队成员缺乏主动沟通意识四个主要方面，并分析产生上述沟通问题的原因。

针对上述沟通管理问题及产生的原因，结合 J 公司组织结构特点及项目的实际情况，御用沟通管理的相关理论基础，以优化项目沟通现状为目标，提出一些改进策略。具体而言 包括增强项目经理的领导力，增强员工的专业实践，完善项目的沟通规划，完善项目的沟通机制。

J 公司开发项目的管理是一个复杂且多变的过程，基于科学的项目沟通管理，可以及时准确的传递项目的相关信息，因此在项目管理中强化沟通管理是确保项目管理有效性的关键保障。本文结合沟通、项目沟通以及沟通管理的相关理论，以 J 公司开发项目为例，分析该公司在项目管理中存在的沟通管理问题，可得出以下结论：

首先，J 公司作为新能源汽车零部件的开发供应商，其开发项目多元化、范围广、灵活性要求高、阶段性强、临时性强、紧迫性强、难度大等特点，项目团队通常为临时组建的形式形成，其中项目中的沟通协调工作及沟通管理工作由项目经理承担和主导。项目的沟通以正式沟通为主，非正式沟通为辅。信息由高层级流向低层级，信息沟通管理模式为信息逐层传递模式。

其次，J 公司开发项目存在较多沟通管理问题。包括项目沟通计划的执行度差、团队成员沟通信息不准确、项目成员沟通方式运用不当、团队成员缺乏主动沟通意识。结合沟通管理相关理论分析出其原因分别为沟通计划缺乏制度化保障、部分团队成员实践经验少、项目沟通方式规范不清晰、组织缺乏健康的沟通氛围。综合而言，J 公司项目沟通管理存在的问题与沟通主体、沟通构成、沟通环境密切相关。

此外，为改进 J 公司开发项目的沟通管理现状，可以采取以下措施来提升沟通管理的效果：完善项目的沟通管理制度，通过项目沟通的监督、改进以及激励机制对成员行为进行有效约束和激励；丰富员工的专业实践经验，通过优化导师带徒制活动及定期的技能培训，让员工切实掌握开发类的专业知识以及提升沟通技能；同步明确项目沟通方式的标准规范，完善项目的沟通方式；最后还需要营造友好的组织沟通氛围，完善项目的沟通渠道，设立合理的沟通反馈机制。

最后，为了确保改进策略的顺利执行，J 公司高层管理者需要坚定组建专业项目管理团队的决心，在现代化信息技术的支持下，建立激励机制，提供经费支持，以全面提

中国知网 https://www.cnki.net

高 J 公司项目团队的沟通管理水平和项目管理能力，实现公司的可持续发展。

本文的改进策略有助于改善和提升 J 公司开发项目沟通管理的水平，促进项目管理工作的完善和项目目标的达成，同时也能够为同行业企业提供具有实际意义的参考。

中国知网 https://www.cnki.net

参 考 文 献

[1] (美)项目管理协会. 项目管理知识体系指南(第 7 版)[M]. 北京:电子工业出版社，2021:4-9.
[2] 李志刚. 中小企业内部沟通障碍及对策研究[D]. 暨南大学 2009.
[3] 韩广彦. 企业职能部门间的有效沟通问题研究[J]. 中员工学院学报，2005 (15): 23－30.
[4] [美]斯蒂芬·P·罗宾斯. 管理学(第九版)[M]. 北京:中国人民大学出版社，2008.
[5] 刘碧莹. 基于员工关系优化的企业内部沟通管理模式研究——以 H 国际集团为例[J]. 企业改革与管理，2023.
[6] 张莉,林与川,迟冬梅. 组织沟通方式对沟通满意度的影响:沟通认知与沟通倾向的调节作用[J]. 科学学与科学技术管理, 2012,33(2):167-175
[7] 吴亮,吕鸿江. 复杂适应视角下团队正式与非正式沟通及其匹配机理研究[J]. 经济经纬，2019,36(06):103-109.
[8] 杰哈德.葛使汪纳德. 你所不知道的销售密码 北京：人民邮电出版社. 2008.7.
[9] 王培才. 浅谈沟通方式对沟通质量的影响 商业现代化. 2007(34):123-124.
[10] Adler.Mortimer J.New Encylopedia Britannica 15[C], Chicago: Encyclopedia Britannica. 1974.
[11] 李卉,阮相君,吴庭功,等. 浅析沟通管理在项目管理中的应用[J]. 时代汽车，2021,(02):57-58.
[12] 王志远. 团队建设与工程项目成功[J]. 工程管理学报，2021,39(2):67-73.
[13] 吴威龙. 产品研发项目沟通管理研究[D]. 北京邮电大学. 2023.DOI:10.26969/d.cnki.gbydu.2023.001147.
[14] 迟婷婷. 项目管理沟通在项目管理中的应用[J]. 住宅与房地产，2020(03):121-122.
[15] 张明. 现代工程项目管理中的沟通与协作技巧研究[J]. 项目管理与控制，2018,25(1):32-38.
[16] 张迪. 基于软件开发项目管理平台的有效沟通管理[J]. 智能城市，2016,2(03):38-39.DOI:10.19301/j.cnki.zncs. 2016.03.019.
[17] 侯仁泉. L 公司短周期研发项目内部沟通机制问题研究[D]. 山东大学,2023.DOI:10.27272/d.cnki.gshdu. 2023.007628.
[18] 凌飞. J 公司项目沟通管理优化策略研究[D]. 山东大学. 2024.DOI:10.27272/d.cnki.gshdu.2022.006850.
[19] 赵明. 项目管理中的沟通与协作策略[J]. 工程管理，2020,38(5):12-18.
[20] 周俊,王峰,宋丽丽. 企业项目管理成熟度模型的构建与应用[J]. 投资与合作，2023,(01):157-159.
[21] 李杨. 大型智能制造企业项目管理成熟度模型和评价指标体系的构建及其应用研究[D].湖北工业大学,2020.DOI:10.27131/d.cnki.ghugc.2020.000998.
[22] Eric G. Too，Patrick Weaver. The management of project management：A conceptual framework for project governance[J]. International Journal of Project Management，2014，8： 1382-1394.
[23] 马虎信. 港口工程承包商 EPC 项目管理成熟度模型及应用研究[D]. 天津大学. 2016.
[24] Young Hoon Kwak, William Ibbs, Project Management Process Maturity Model [J]. Journal of Management in Engineering, 2002(7), 150-155.

中国知网 https://www.cnki.net

[25] OGC, Project management maturity model (PMMM), OGC-Release Version 5.0, 2002.
[26] 徐亮辉. 汽车零部件企业的项目管理成熟度模型研究[D]. 上海交通大学，2012.
[27] Harold Kerzner.Strategic planning for project management using a project management maturity model[J]. New York NY，2011：198-199.
[28] Project Management Solutions Inc. Project management maturity model.PM solutions[J]，2011：57-60.
[29] Qin L X, Hong S. Effective executives operating in the project management process[C]，Second International Conference on Communication Systems，2010.
[30] 当代管理理论的大师—克瑞斯·阿吉里斯[J]. 现代班组，2010,(07):27.
[31] SM N K ,Innocent M,Ngala J A.Evaluating the relationship between communication management practices and project outcomes: a case study of Eswatini (Swaziland) construction industry [J].Construction Economics and Building，2019,19(2):197-219.
[32] 张为杰. 企业通用人力资本培训激励研究——基于贝克尔模型的视角[J]. 经济与管理，2011,25(07):34-38.
[33] 邬靓. 开展多领域技能培训实现人才企业双向赋能[N]. 南昌日报. 2024-07-17(004).DOI:10.28591/n.cnki.nncrb. 2024.001941.
[34] Reichers A E, & Schneider B. Climate and culture: An evolution of constructs In Schneider (Ed.), Organization climate and culture[M]. San Francisco: Jossey-Bass，1990: 5-39.
[35] Brian J G .Effective Strategies for Communicating and Managing Communication in a Project Team: My Perspective[J]. International Journal of Applied Industrial Engineering (IJAIE)，2021,8(1):1-11.
[36] 王文宇. 企业项目管理中项目成员激励模式的研究[J]. 项目管理技术，2022,20(06):142-146.
[37] 张迪. 基于软件开发项目管理平台的有效沟通管理[J]. 智能城市，2016,2(03):38-39.DOI:10.19301/j.cnki.zncs，2016.03.019.
[38] 彼得·德鲁克.《卓有成效的管理者》[J]. 当代电力文化，2018,(04):90.
[39] 侯仁泉.L 公司短周期研发项目内部沟通机制问题研究[D]. 山东大学, 2023.DOI:10.27272/d.cnki.gshdu. 2023.007628.
[40] 石晓宇. A 石油公司大牛地项目沟通管理案例研究[D]. 大连理工大学, 2021.DOI:10.26991/d.cnki.gdllu. 2021.001875.
[41] 刘文. HL 公司组织沟通氛围优化方案设计[D]. 陕西师范大学，2017.

中国知网 https://www.cnki.net
